

**Kindergartenzweckverband Armuthsbachtal**

Verbandsgemeindeverwaltung Adenau · Kirchstraße 15 – 19 · 53518 Adenau

Kreisverwaltung Ahrweiler  
-Kreisjugendamt-  
Wilhelmstraße 24 – 30  
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Verbandsgemeinde



Kreisverwaltung  
003306 28.02.24  
Ahrweiler

Datum: 26.02.2024 am Nürburgring  
Auskunft: Bernhard Jüngling  
Zimmer: A1.02  
Telefon: (02691) 305-0  
Durchwahl: (02691) 305-100  
Telefax: (02691) 305-199  
Internet: [www.adenau.de](http://www.adenau.de)  
Mail: [bernhard.juengling@adenau.de](mailto:bernhard.juengling@adenau.de)  
Aktenzeichen: FB 1-461-8-2-01

**Gewährung einer Zuwendung aus Kreismitteln für die Sanierung des Untergeschosses der Kindertagesstätte Wershofen**

Unser Antrag vom 24.07.2018


Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt übersenden wir Ihnen eine Übersicht mit den dazugehörigen Rechnungen für die Sanierung des Untergeschosses der Kindertagesstätte Wershofen.

Die Sanierungsarbeiten im Untergeschoss der Kindertagesstätte Wershofen sind abgeschlossen und es sind Gesamtkosten in Höhe von 82.010,58 € entstanden.

Wir bitten um Auszahlung des Kreiszuschusses nach Ziffer 8.6 der Förderrichtlinien in Höhe von einem Drittel der zuwendungsfähigen Kosten von 82.010,58 € = 27.336,86 € für die Sanierung des Untergeschosses der Kindertagesstätte Wershofen.

Mit freundlichen Grüßen

  
Guido Nisius  
Verbandsvorsteher



Eingegangen

13. Juni 2022

Verbandsgemeinde Adenau

I II III IV V

Monreal Glas- & Gebäudereinigung GmbH | Johannisstr. 7 | 53474 Bad Neuenahr



Glas- & Gebäudereinigung

GmbH



2020021011

Verbandsgemeindeverwaltung Adenau

Fachbereich Planen und Bauen

z.Hd. Johannes Thiesen

Kirchstraße 15-19

53518 Adenau

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

Zur Kenntnis genommen ✓

Rechnung 4002943

Kundennummer: 10637

Rechnungsnummer: 4002943

Datum: 10.06.2022

Hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Positionen in Rechnung.

Objekt : 53520 Wershofen, Nordstraße 25, Kifa St. Vincentius Wershofen

Ausführungsdatum: 10.06.2022

Pos	Anzahl	Preis	Einheit	Beschreibung	Netto
1	280	2,15 €	qm	Desinfektionsmittel Reinigung mittels Isopropanol behandeln	602,00 €
2	280	0,85 €	qm	Absaugen mittels Industriestaubsauger HEPA Filter	238,00 €
3	80	2,49 €	Stk.	Reinigungsmittel Isopropanol	199,20 €
4	4,5	42,50 €	Std.	Glas- und Rahmengrundreinigung inkl. Rahmen u. Falz	191,25 €
5	1	22,50 €	Stk.	Material , Schutzanzug	22,50 €
6	1	25,00 €	F.P.	An-Abfahrt Pauschal	25,00 €

Monreal  
Glas- & Gebäudereinigung GmbH

Johannisstr. 7  
53474 Bad Neuenahr  
Tel: 02641 - 308 103 0  
Fax: 02641 - 308 103 9  
info@gebaeudereinigung-monreal.de  
www.gebaeudereinigung-monreal.de  
Steuernummer: 01/665/19209

Bankverbindung:

Volksbank Rhein-Ahr-Eifel eG  
BIC: GENODE33BNA  
IBAN: DE15577615910616797900

Geschäftsführer: Dennis Monreal

Eingetragen beim  
Amtsgericht Koblenz, HRB 25543

Zwischensumme netto:	1.277,95 €
Ust 19 % (1.277,95 €):	242,81 €
<hr/>	
<b>Gesamt brutto:</b>	<b>1.520,76 €</b>

Zahlbar innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsstellung



Im BezahlCode sind die Zahlungsdaten für die Überweisung hinterlegt. Diese werden automatisch übernommen und ersparen dir das mühsame und fehleranfällige Abtippen einer Überweisung. Scanne dazu einfach den BezahlCode mit deinem Smartphone. Weitere Informationen findest du unter <http://www.bezahlcode.de>.

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

1. TBZ  
2. TBZ

Bü 87570

**PROMET  
IMPEX**

prometimpex.com

**Eingegangen**

08. März 2023

Verbandsgemeinde Adenau

I	II	III	IV	V
---	----	-----	----	---



2020025456

Prometimpex GmbH, Körnerstraße 1, 44791 Bochum

Kindergartenzweckverband Armutshbachtal  
Kirchstr. 15-19  
53518 Adenau

## 1. Teilrechnung

RECHNUNG 52302015

Datum: 28.02.2023

Unsere Ref.: LU

Unsere Lieferantennr.:

Kunden-Nr.: 15300

Ihre USt-IdNr.:

Ihre Ref.: Herr Thiesen

Ihre Bestellnr.: vom 08.12.2022

Projekt: Schimmelpilzsanierung  
Kindertagesstätte St. Vincentius in Wershofen

Kostenstelle:

Leistungszeitraum: Februar 2023

Pos.	Ausführung/Leistungsverzeichnis	Menge	Einheit	Preis/EUR	Betrag/EUR
	gemäß Angebot 5180 16422 vom 18.11.2022				
1	Baustelleneinrichtung: Baustelle einrichten und nach Beendigung der Massnahme wieder räumen, inkl. Wasseranschluss und Stromanschluss am bestehenden Stromkreis.	1	Stück	1.044,00 €	1.044,00 €
2	Personaldekontaminationseinheit liefern, aufbauen, reinigen, abbauen und wieder abfahren.	1	Stück	537,00 €	537,00 €
3	Unterdruckanlage DEH 5000 cbm/h mit Hoch- leistungsfILTER der Kategorie "H" liefern, aufbauen, reinigen und wieder abfahren, inkl. Filterwechsel- kosten.	1	Stück	657,60 €	657,60 €
4	Hochleistungs-Industriesauger der Kategorie "H" liefern, aufbauen, reinigen, abbauen und wieder abfahren, inkl. Filterwechselkosten.	1	Stück	834,60 €	834,60 €

Übertrag auf Seite 2:

3.073,20 €

Prometimpex GmbH  
Körnerstr. 1  
44791 Bochum  
Germany

T +49 234 973 38-0  
F +49 234 973 38-25  
info@prometimpex.com  
www.prometimpex.com

Geschäftsführer: Frank Schmidtgen, Nicole Rose  
Amtsgericht Bochum, HRB 7375, USt-IdNr. DE813083667

Sparkasse Bochum: IBAN DE77 4305 0001 0001 6232 63, BIC WELADED1BOC





RECHNUNG 52302015

Kunden-Nr.: 15300

Pos.	Ausführung/Leistungsverzeichnis	Menge	Einheit	Preis/EUR	Betrag/EUR
	Übertrag von Seite 1:				3.073,20 €
5	Liefern, aufbauen, abbauen, umstzen von fahrbaren Gerüst und Leitern.	1	Stück	156,00 €	156,00 €
6	Abschottung mit Folie und Holz-UK, nach Sanierung wieder abbauen und der Entsorgung zuführen.	5,399	m <sup>2</sup>	16,80 €	90,70 €
7	Demontage und Abbruch von Gips Vorsatzschalen, Stützenverkleidungen und Gipsdecken, Rohrverkleidungen, inkl. Transport zum Container.	1	pau.	2.160,00 €	2.160,00 €
8	Demontage und Abbruch der Tapeten (teils doppelt), verpacken und zum Container transportieren. Bereiche: Flur, Wickelraum, Gruppenraum 3 und Bewegungsraum. Wände und Decken	192,122	m <sup>2</sup>	8,40 €	1.613,82 €
9	Demontage und Abbruch von Oberputz (bis 8 mm) mit staubarmen Fräsverfahren, um Pilzsporen zu entfernen. Decke und Wände	156,100	m <sup>2</sup>	34,50 €	5.385,45 €
10	Grob- und Feinreinigung aller Flächen durch Absaugung und Feuchtwischverfahren. Abrechnung erfolgt nach Grundfläche.	108,134	m <sup>2</sup>	8,40 €	908,33 €
11	Aufbringen von Wasserstoffperoxid durch Sprühverfahren auf allen Flächen und nach Einwirkzeit zur Luftkeimzahlmessungen bereit stellen.	418,35	m <sup>2</sup>	19,65 €	8.220,52 €
<b>Netto Summe:</b>					<b>21.608,02 €</b>
<b>MwSt 19 %</b>					<b>4.105,52 €</b>
<b>Brutto Summe:</b>					<b>25.713,55 €</b>

Zahlung bis zum 17.03.2023 ohne Abzug.

Die Freistellungsbescheinigung nach § 48 Abs. 1 EStG (Bauabzugssteuer) liegt vor und kann von Ihnen bei Bedarf angefordert werden.





Kunde: Verbandsgemeindeverwaltung Adenau Seite: 1

 BV: Kita St. Vincentius Wershofen

 Teilobjekt: Schimmelpilzsanierung

 Bestellnummer: 1. Abschlag vom Datum: 12.12.2022

Pos. Nr.	Leistungsbeschreibung Kurztext	Anzahl	Länge m	Breite m	Höhe m	Gesamt	Einheit
1	Baustelle einrichten usw.	1,000					Stück
2	Personaldekontaminationseinheit liefern, aufbauen, reinigen, abbauen usw.	1,000					Stück
3	Unterdruckanlage DEH5000 cbm/h mit Hochleistungsfilter der Kategorie "H"	1,000					Stück
4	Hochleistungs-Industriesauger der Kategorie "H" liefern, aufbauen, reinigen, abbauen	1,000					Stück
5	Liefern, aufbauen, abbauen, umsetzen von fahrbarem Gerüst und Leitern	1,000					Stück
6	Abschottung mit Folie und Holz-UJK, nach Sanierung wieder abbauen usw.						
	Bereichszugang			1,350	2,200	2,970	m <sup>2</sup>
	Fenster	2,00		1,380	0,880	2,429	m <sup>2</sup>
						5,399	m <sup>2</sup>
7	Demontage und Abbruch von Gips, Vorsatzschalen, Stützenverkleidungen usw.	1,00					psch.
8	Demontage und Abbruch der Tapeten (teils doppelt), verpacken und zum Container transportieren.						
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00	13,750		2,150	59,125	m <sup>2</sup>
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00		5,980	2,150	25,714	m <sup>2</sup>
	Decke Gruppe 3		siehe Plan			41,530	m <sup>2</sup>
	Decke Bewegung		siehe Plan			39,110	m <sup>2</sup>
	Wand Flür Gruppe 3	2,00	3,660		2,150	15,738	m <sup>2</sup>
	Wand Flür Gruppe 3	2,00		1,370	2,150	5,891	m <sup>2</sup>
					Übertrag:	187,108	

 Für die Richtigkeit:  
 Datum: 02.03.2023  
 Datum: 02.03.2023

 Fertigstellung am: 06.02.2023  
 Prometimpex: V. Kriwokat  
 Auftraggeber: Verbandsgemeindeverwaltung  
53518 Adenau

Kunde: Verbandsgemeindeverwaltung Adenau Seite: 2

BV: Kita St. Vincentius Wershofen

Tellobjekt: Schimmelpilzsanierung

Bestellnummer: 1. Abschlag vom Datum: 12.12.2022

Pos. Nr.	Leistungsbeschreibung Kurztex	Anzahl	Länge m	Breite m	Höhe m	Gesamt	Einheit
8	Demontage und Abbruch der Tapeten (teils doppelt), verpacken und zum Container transportieren.				Übertrag:	187,108	m <sup>2</sup>
	Decke Flur Gruppe 3		3,660	1,370		5,014	m <sup>2</sup>
						192,122	m <sup>2</sup>
9	Demontage und Abbruch von Oberputz (bis 8mm) mit staubarmen Fräsverfahren						
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00	13,750		2,150	59,125	m <sup>2</sup>
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00		5,980	2,150	25,714	m <sup>2</sup>
	Wand Wickelraum	2,00	2,650		1,950	10,335	m <sup>2</sup>
	Wand Wickelraum	2,00		1,360	1,950	5,304	m <sup>2</sup>
	Wand Flur Gruppe 3	2,00	3,660		2,150	15,738	m <sup>2</sup>
	Wand Flur Gruppe 3	2,00		1,370	2,150	5,891	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		9,200		1,950	17,940	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		9,250		0,850	7,863	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		2,000		1,950	3,900	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		2,200		1,950	4,290	m <sup>2</sup>
						166,100	m <sup>2</sup>
10	Grob und Feinreinigung aller Flächen durch Absaugung und Feuchtwischverfahren						
	Hauptflur			siehe Plan		19,190	m <sup>2</sup>
	Gruppenraum 3			siehe Plan		41,530	m <sup>2</sup>
	Bewegung			siehe Plan		39,110	m <sup>2</sup>
	Wickelraum			siehe Plan		3,290	m <sup>2</sup>
	Flur zum Abstellraum		3,660	1,370		5,014	m <sup>2</sup>
						108,134	m <sup>2</sup>

Für die Richtigkeit: \_\_\_\_\_ Datum: 02.03.2023

Fertigstellung am: 06.02.2023

PrometImplex: [Signature]

Datum: 02.03.2023 Auftraggeber: Verbandsgemeindeverwaltung  
53518 Adenau

Kunde: Verbandsgemeindeverwaltung Adenau Seite: 3  
 BV: Kita St. Vincentius Wershofen  
 Teilobjekt: Schimmelpilzsanierung  
 Bestellnummer: 1. Abschlag vom Datum: 12.12.2022

Pos. Nr.	Leistungsbeschreibung Kurztext	Anzahl	Länge m	Breite m	Höhe m	Gesamt	Einheit
11	Aufbringen von Wasserstoffperoxid durch Sprühverfahren auf allen Flächen						
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00	13,750		2,520	69,300	m <sup>2</sup>
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00		5,980	2,520	30,139	m <sup>2</sup>
	Wand-Wickelraum	2,00	2,650		2,520	13,356	m <sup>2</sup>
	Wand Wickelraum	2,00		1,360	2,520	6,854	m <sup>2</sup>
	Wand Flur Gruppe 3	2,00	3,660		2,520	18,446	m <sup>2</sup>
	Wand Flur Gruppe 3	2,00		1,370	2,520	6,905	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		9,200		2,520	23,184	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		9,250		2,520	23,310	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		2,000		2,520	5,040	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		2,200		2,520	5,544	m <sup>2</sup>
	Decke Hauptflur			siehe Plan		19,190	m <sup>2</sup>
	Decke Gruppenraum 3			siehe Plan		41,530	m <sup>2</sup>
	Decke Bewegung			siehe Plan		39,110	m <sup>2</sup>
	Decke Wickelraum			siehe Plan		3,290	m <sup>2</sup>
	Decke Flur zum Abstellraum		3,660	1,370		5,014	m <sup>2</sup>
	Boden Hauptflur			siehe Plan		19,190	m <sup>2</sup>
	Boden Gruppenraum 3			siehe Plan		41,530	m <sup>2</sup>
	Boden Bewegung			siehe Plan		39,110	m <sup>2</sup>
	Boden Wickelraum			siehe Plan		3,290	m <sup>2</sup>
	Boden Flur zum Abstellraum		3,660	1,370		5,014	m <sup>2</sup>
						418,347	m <sup>2</sup>

Für die Richtigkeit:

Datum: 02.03.2023

Datum: 02.03.2023

Fertigstellung am: 06.02.2023

Prometimpex: [Signature]

Auftraggeber: Verbandsgemeindeverwaltung  
53518 Adenau



PROMET  
IMPEX

Aufmaß

Kunde: Verbandsgemeindeverwaltung Adenau Seite: 4

BV: Kita St. Vincentius Wershofen

Tellobjekt: Schimmelpilzsanierung

Bestellnummer: 1. Abschlag vom Datum: 12.12.2022

Pos. Nr.	Leistungsbeschreibung Kurztext	Anzahl	Länge m	Breite m	Höhe m	Gesamt	Einheit
12	Containergestellung für Abfälle	1,000					Stück
13	Baumischabfälle, Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein Wiegeschein	0,000					to.
14	Sanierungsfacharbeiter für Arbeiten im Weißbereich	0,000					Stunden
15	Sanierungsfacharbeiter für Arbeiten im Schwarzbereich	0,000					Stunden
	Gesamt:					880,102	m <sup>2</sup>

Für die Richtigkeit:

Datum: 02.03.2023

Datum: 02.03.2023

Fertigstellung am: 06.02.2023

Prometimpex:

Auftraggeber:

V. Weiwald  
Verbandsgemeindeverwaltung  
53518 Adenau

**PROMET  
IMPEX**<sup>®</sup>

prometimpex.com

PrometImpex GmbH, Körnerstraße 1, 44791 Bochum

Kindergartenzweckverband Armuthsbachtal  
Kirchstr. 15-19  
53518 Adenau



2020026072

Eingegangen

17. April 2023

Verbandsgemeinde Adenau

I	II	III	IV	V
---	----	-----	----	---



FB2

## Schlussrechnung

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

RECHNUNG 52304002

Datum: 13.04.2023

Unsere Ref.: LU

Unsere Lieferantenr.:

Kunden-Nr.: 15300

Ihre USt-IdNr.:

Ihre Ref.: Herr Thiesen

Ihre Bestellnr.: vom 08.12.2022

Projekt: Schimmelpilzsanierung  
Kindertagesstätte St. Vincentius in Wershofen

Kostenstelle:

Leistungszeitraum: Februar-April 2023

Pos.	Ausführung/Leistungsverzeichnis	Menge	Einheit	Preis/EUR	Betrag/EUR
	gemäß Angebot 5180 16422 vom 18.11.2022 zu 1. Teilrechnung 52302015 vom 28.02.2023				
1	Containergestellung für Abfälle (pro Container)	1	Stück	186,00 €	186,00 €
2	Baumischabfälle, Abrechnung erfolgt nach Wiegéschein	1,54	To.	462,00 €	711,48 €
				Netto Summe:	897,48 €
				MwSt 19 %	170,52 €
				Brutto Summe:	1.068,00 €

Zahlung bis zum 27.04.2023 ohne Abzug.

Die Freistellungsbescheinigung nach § 48 Abs. 1 EStG (Bauabzugssteuer) liegt vor und kann von Ihnen bei Bedarf angefordert werden.

Prometimpex GmbH  
Körnerstr. 1  
44791 Bochum  
Germany

T + 49 234 973 38-0  
F + 49 234 973 38-25  
info@prometimpex.com  
www.prometimpex.com

Geschäftsführer: Frank Schmidtgen, Nicole Rose  
Amtsgericht Bochum, HRB 7375, USt-IdNr. DE813083667

Sparkasse Bochum: IBAN DE77 4305 0001 0001 6232 63, BIC WELADED1BOC





Kunde: Verbandsgemeindeverwaltung Adenau

 Seite: 1

 BV: Kita St. Vincentius Wershofen

 Teilobjekt: Schimmelpilzsanierung

 Bestellnummer: Schlussaufmaß

 vom Datum: 12.12.2022

Pos. Nr.	Leistungsbeschreibung Kurztext	Anzahl	Länge m	Breite m	Höhe m	Gesamt	Einheit
1	Baustelle einrichten usw.	1,000					Stück
2	Personalekontaminationseinheit liefern, aufbauen, reinigen, abbauen usw.	1,000					Stück
3	Unterdruckanlage DEH5000 cbm/h mit Hochleistungsfilter der Kategorie "H"	1,000					Stück
4	Hochleistungs-Industriesauger der Kategorie "H" liefern, aufbauen, reinigen, abbauen	1,000					Stück
5	Liefern, aufbauen, abbauen, umsetzen von fahrbarem Gerüst und Leitern	1,000					Stück
6	Abschottung mit Folie und Holz-UK, nach Sanierung wieder abbauen usw.						
	Bereichszugang			1,350	2,200	2,970	m <sup>2</sup>
	Fenster	2,00		1,380	0,880	2,429	m <sup>2</sup>
						5,399	m <sup>2</sup>
7	Demontage und Abbruch von Gips, Vorsatzschalen, Stützenverkleidungen usw.	1,00					psch.
8	Demontage und Abbruch der Tapeten (teils doppelt), verpacken und zum Container transportieren.						
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00	13,750		2,150	59,125	m <sup>2</sup>
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00		5,980	2,150	25,714	m <sup>2</sup>
	Decke Gruppe 3		siehe Plan			41,530	m <sup>2</sup>
	Decke Bewegung		siehe Plan			39,110	m <sup>2</sup>
	Wand Flur Gruppe 3	2,00	3,660		2,150	15,738	m <sup>2</sup>
Wand Flur Gruppe 3	2,00		1,370	2,150	5,891	m <sup>2</sup>	
					Übertrag:	187,108	

Für die Richtigkeit:

 Fertigstellung am: 13.04.2023

 Datum: 13.04.2023

 PrometimpeX: *[Signature]*  
 Verbandsgemeindeverwaltung  
 Auftraggeber: 53518 Adenau

Datum: \_\_\_\_\_

Kunde: Verbandsgemeindeverwaltung Adenau

Seite: 2

BV: Kita St. Vincentius Wershofen

Teilobjekt: Schimmelpilzsanierung

Bestellnummer: Schlussaufmaß

vom Datum: 12.12.2022

Pos. Nr.	Leistungsbeschreibung Kurztext	Anzahl	Länge m	Breite m	Höhe m	Gesamt	Einheit
8	Demontage und Abbruch der Tapeten (teils doppelt), verpacken und zum Container transportieren.				Übertrag:	187,108	m <sup>2</sup>
	Decke Flur Gruppe 3		3,660	1,370		5,014	m <sup>2</sup>
						192,122	m <sup>2</sup>
9	Demontage und Abbruch von Oberputz (bis 8mm) mit staubarmen Fräsverfahren						
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00	13,750		2,150	59,125	m <sup>2</sup>
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00		5,980	2,150	25,714	m <sup>2</sup>
	Wand Wickelraum	2,00	2,650		1,950	10,335	m <sup>2</sup>
	Wand Wickelraum	2,00		1,360	1,950	5,304	m <sup>2</sup>
	Wand Flur-Gruppe 3	2,00	3,660		2,150	15,738	m <sup>2</sup>
	Wand Flur Gruppe 3	2,00		1,370	2,150	5,891	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		9,200		1,950	17,940	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		9,250		0,850	7,863	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		2,000		1,950	3,900	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		2,200		1,950	4,290	m <sup>2</sup>
						156,100	m <sup>2</sup>
10	Grob und Feinreinigung aller Flächen durch Absaugung und Feuchtwischverfahren						
	Hauptflur			siehe Plan		19,190	m <sup>2</sup>
	Gruppenraum 3			siehe Plan		41,530	m <sup>2</sup>
	Bewegung			siehe Plan		39,110	m <sup>2</sup>
	Wickelraum			siehe Plan		3,290	m <sup>2</sup>
	Flur zum Abstellraum		3,660	1,370		5,014	m <sup>2</sup>
						108,134	m <sup>2</sup>

Für die Richtigkeit:

Fertigstellung am: 13.04.2023

Datum: 13.04.2023

Prometimpex: i. V. Herberich

Datum: \_\_\_\_\_

Auftraggeber: Verbandsgemeindeverwaltung  
53518 Adenau

Kunde: Verbandsgemeindeverwaltung Adenau

Seite: 3

BY: Kita St. Vincentius Wershofen

Tellobjekt: Schimmelpilzsanierung

Bestellnummer: Schlussaufmaß

vom Datum: 12.12.2022

Pos. Nr.	Leistungsbeschreibung Kurztext	Anzahl	Länge m	Breite m	Höhe m	Gesamt	Einheit
11	Aufbringen von Wasserstoffperoxid durch Sprühverfahren auf allen Flächen						
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00	13,750		2,520	69,300	m <sup>2</sup>
	Wand Bewegung u. Gruppe 3	2,00		5,980	2,520	30,139	m <sup>2</sup>
	Wand Wickelraum	2,00	2,650		2,520	13,356	m <sup>2</sup>
	Wand Wickelraum	2,00		1,360	2,520	6,854	m <sup>2</sup>
	Wand Flur Gruppe 3	2,00	3,660		2,520	18,446	m <sup>2</sup>
	Wand Flur Gruppe 3	2,00		1,370	2,520	6,905	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		9,200		2,520	23,184	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		9,250		2,520	23,310	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		2,000		2,520	5,040	m <sup>2</sup>
	Wand Hauptflur		2,200		2,520	5,544	m <sup>2</sup>
	Decke Hauptflur			siehe Plan		19,190	m <sup>2</sup>
	Decke Gruppenraum 3			siehe Plan		41,530	m <sup>2</sup>
	Decke Bewegung			siehe Plan		39,110	m <sup>2</sup>
	Decke Wickelraum			siehe Plan		3,290	m <sup>2</sup>
	Decke Flur zum Abstellraum		3,660	1,370		5,014	m <sup>2</sup>
	Boden Hauptflur			siehe Plan		19,190	m <sup>2</sup>
	Boden Gruppenraum 3			siehe Plan		41,530	m <sup>2</sup>
	Boden Bewegung			siehe Plan		39,110	m <sup>2</sup>
	Boden Wickelraum			siehe Plan		3,290	m <sup>2</sup>
	Boden Flur zum Abstellraum		3,660	1,370		5,014	m <sup>2</sup>
						<b>418,347</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

Für die Richtigkeit:

Datum: 13.04.2023

Datum: \_\_\_\_\_

Fertigstellung am: 13.04.2023

PrometimpeX: i.v. Kula

Auftraggeber: Verbandsgemeindeverwaltung  
53518 Adenau

Kunde: Verbandsgemeindeverwaltung Adenau Seite: 4

BV: Kita St. Vincentius Wershofen

Teilobjekt: Schimmelpilzsanierung

Bestellnummer: Schlussaufmaß vom Datum: 12.12.2022

Pos. Nr.	Leistungsbeschreibung Kurztext	Anzahl	Länge m	Breite m	Höhe m	Gesamt	Einheit
12	Containergestellung für Abfälle	1,000					Stück
13	Baumischabfälle, Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein						
	Wiegeschein	1,540					to
14	Sanierungsfacharbeiter für Arbeiten im Weißbereich	0,000					Stunden
15	Sanierungsfacharbeiter für Arbeiten im Schwarzbereich	0,000					Stunden
	<b>Gesamt:</b>					<b>880,102</b>	<b>m²</b>

Für die Richtigkeit:

Datum: 13.04.2023

Datum: \_\_\_\_\_

Fertigstellung am: 13.04.2023

Prometimpex: i. V. Kita

Auftraggeber: Verbandsgemeindeverwaltung  
53518 Adenau

WIEGESCHEIN

- Duplikat -



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

**Anlieferung**

REMONDIS GmbH & Co. KG  
NL Bonn-Rhein-Sieg-Ahr  
Entenweiherweg 14-16  
53489 Sinzig

Wiegescchein-Nr.: 6249070375  
Leistungsschein: 6241382698

2 / 22.03.2023 / 10:50

**Erzeuger : 76243422**

**Beförderer : 61545100**

**Empfänger : 61545100**

Kindertagesstätte Wershofen

REMONDIS GmbH & Co. KG

REMONDIS GmbH & Co. KG

Nordstr. 25  
D 53520 Wershofen

Entenweiherweg 14 - 16  
D 53489 Sinzig

Entenweiherweg 14 - 16  
D 53489 Sinzig

**KFZ-Kennzeichen: AW-RE 2200**

**angelieferter Stoff:**

26/170904 /021 HBCD-Freie Baumlisch z.Vorbeh.

**Störstoffe:**

**Anmerkungen:**

Hr. Hoffmann

Waage / Terminal	Id.Nr	Gewicht	Einheit	Datum	Uhrzeit	
	029957	12220 kg		22.03.2023	10:39	Erstwägung
	029958	10680 kg		22.03.2023	10:50	Zweitwägung

**BRUTTO(kg) 12220      TARA(kg) 10680      NETTO(kg) 1540**

Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen, vgl. unter [www.remondia.de/agb](http://www.remondia.de/agb)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Wägenden

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Anliefernden

Messwerte aus frei programmierbarer Zusatzeinrichtung. Die geeichten Messwerte können eingesehen werden.

REMONDIS GmbH & Co. KG NL Bonn-Rhein-Sieg-Ahr  
 Entenweiherweg 14-16  
 53489 Sinzig  
 Telefon: 02642/972222  
 Fax: 02642/972223  
 eMail: vertrieb.bonn@remondis.de



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

**LEISTUNGSNACHWEIS**


**Auftrag: 6241382698**

**Mi, 22.03.2023**

Kfz-Kennz.: AW-RE 2200

Fzg-Grp.: Absetzkipper

Tour: 62400305/20 Schicht: 1



Anfallstelle:

Anteil:

**Leistungsort / Ladestelle: 76243422**

Kindertagesstätte Wershofen

Nordstr. 25  
 53520 Wershofen

**Rechnungsempf. / Auftraggeber: 76231433**

SES GmbH  
 Sanierungs- und  
 Entsorgungssysteme

In der Struth 16  
 65620 Waldbrunn (Westerwald) (Fussingen)  
 Telefon: 06479/91082 + 83

**Anlage / Entladestelle: 29996**

REMONDIS GmbH  
 Umschlaganlage  
 Entenweiherweg 14 - 16  
 53489 Sinzig  
 Telefon: 02642/972226 AP: Herr Rausche  
 Entsorger-Nr.: G00576277 / 2

**Auftragnehmer / Beförderer: E31584820**

REMONDIS GmbH & Co. KG  
 Robert-Bosch-Str. 20-22  
 50769 Köln  
 Telefon: 0221/97060-0

**Stoff: 26/170904 21 HBCD-Freie Baumisch z. Verbeh.**

**7,0 cbm AK Container**

**1,0000 STK**

**Volle(n) Behälter abziehen**

**ESN:**

**Behälterbewegung**

**BGS / ÜNS:**

**Container-Nr.: AN: \_\_\_\_\_ AB: \_\_\_\_\_**

**SBGS:**

**Bemerkungen: Hr. Kratzheller 0171-2848712**

Unterschrift Kunde: *Verbandsgemeindeverwaltung  
 53518 Adenau*

Unterschrift Fahrer: *[Signature]*

Datum:

Vermerke: .....

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

Emons Bau GmbH - Kapellenstr.14 - 53520 Hümmel-Pitscheid

VG Adenau Fachbereich Planen und Bauen

Kirchstraße 15-19  
53518 Adenau

Emons Bau GmbH

Kapellenstr.14  
53520 Hümmel-Pitscheid  
Bank: Kreissparkasse Ahrweiler  
Konto-Nr.: 150177  
BLZ: 577 513 10  
IBAN: DE07 5775 1310 0000 1501 77  
BIC: MALADE51AHR  
St-Nr.: 01/661/0092/7  
USt-IdNr.: DE 183744801

Seite: 1

15.04.2023

Rechnungsnummer 40622

Sehr geehrte Damen und Herren,  
hiermit erlauben wir uns folgende Positionen in Rechnung zu stellen:

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtpreis EUR
	Stundenlohnarbeiten Kindergarten Wershofen		
	16,000 h	53,50	856,00
	<b>Facharbeiterstunde</b>		
	Stundenlohnarbeiten Nachweis:		
	20.03.2023-6,5 Std		
	23.03.2023-6,5Std		
	24.03.2023-4Std		
	16,000 h	48,50	776,00
	<b>Helferstunde</b>		
	Stundenlohnarbeiten Nachweis:		
	20.03.2023-6,5 Std		
	23.03.2023-6,5Std		
	24.03.2023-4Std		
	1,000 Psch	812,88	812,88
	<b>Material</b>		
	Ytong-Steine,Kleber,Putz u. Mauermörtel.		
	<b>Summe Stundenlohnarbeiten Kindergarten Wershofen</b>		<b>2.444,88</b>


Zusammenfassung

Ordnungszahl	Bezeichnung				Summe in EUR
	Stundenlohnarbeiten Kindergarten Wershofen				2.444,88
	Zwischensumme				2.444,88
		Netto EUR	USt. EUR	%	Brutto EUR
<b>Zahlungsbetrag</b>		<b>2.444,88</b>	<b>464,53</b>	19,00	<b>2.909,41</b>

Zahlung (ohne Abzüge) bis 29.04.2023

Leistungszeitraum: 20.03.2023 bis 24.03.2023

Die gesetzliche Aufbewahrungszeit für Rechnungen beträgt mindestens 2 Jahre.



Zement-Estrich  
Fließ-Estrich  
Industrie-Estrich  
Rüttelboden

Fliesenverlegung

Fliesenausstellung  
(Termine nach Vereinbarung)

Estrich-Fliesen Maas GmbH & Co. KG · Auf der Lehmkauf 5 · 56767 Uess  
An die  
VGV Adenau  
z.Hd. Herrn Thiesen  
Kirchstrasse 15-19

Telefon 02692 482  
Fax 02692 8177  
E-Mail info@estrich-maas.de  
www.estrich-fliesen-maas.de

D-53518 Adenau

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

## Rechnung

Projektnummer : 23-40531-V Kundennr. :  
Bauvorhaben : Wershofen, Nordstraße 25, KiGA  
Rechnungsnummer : 23-14327-RE

Datum : 19.06.2023  
Zeichen : CK  
Seite : 1

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe
Ausführung am 12.06.23					
<u>Estricharbeiten</u>					
Oberbelag: Linoeum					
1	1,00	Stck.	Baustelle einrichten/Anfahrt	80,00 €	80,00 €
2	106,47	m <sup>2</sup>	Abdichtungsbahn Knauf Katja oder gleichwertig liefern und als Feuchtigkeitssperre verlegen	9,90 €	1.054,05 €
3	106,47	m <sup>2</sup>	Hartschaum-Dämmplatten EPS DEO WAB 15 mm, WLG 035, liefern und verlegen	4,60 €	489,76 €
4	106,47	m <sup>2</sup>	Abdeckung der Dämmlage mit PE-Folie sowie umlaufender Randstreifen liefern und verlegen	1,50 €	159,71 €
5	106,47	m <sup>2</sup>	Zement-Estrich CT-F4 als Schwimmenden Estrich in einer Stärke von 35-45 mm verlegen einschl. Sand, Zement und Glasfaserbewehrung	18,00 €	1.916,46 €
6	1,00	Stck	Zulage als schwundreduzierter Schnellzement (z.B. Chemotechnik, Rheotherm)	1.732,00 €	1.732,00 €
				Summe	5.431,98 €
				19,00 % MwSt.	1.032,08 €
				Endsumme	6.404,06 €

Zahlbar nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug.



Zement-Estrich  
Fließ-Estrich  
Industrie-Estrich  
Rüttelboden

Fliesenverlegung

Fliesenausstellung  
(Termine nach Vereinbarung)

Telefon 02692 482  
Fax 02692 8177  
E-Mail [info@estrich-maas.de](mailto:info@estrich-maas.de)  
[www.estrich-fliesen-maas.de](http://www.estrich-fliesen-maas.de)

Estrich-Fliesen Maas GmbH & Co. KG · Auf der Lehnkaul 5 · 56767 Uess

An die  
VGV Adenau  
z.Hd. Herrn Thiesen

Rechnungsnummer : 23-14327-RE

Seite 2

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe
------	-------	-------	--------------	-------	-------

Wir sind verpflichtet Sie darauf hinzuweisen, das Sie diese Rechnung mindestens 2 Jahre lang (als umsatzsteuerlicher Unternehmer: 10 Jahre ) aufzubewahren haben. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Schluss dieses Jahres.

Bei Zahlung bitte Rechnungsnummer und Rechnungsdatum angeben.

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

Malerbetrieb Martin Möseler, Burscheidsnück 6, 53520 Wershofen  
 Verbandsgemeinde Adenau  
 Kita Wershofen  
 Kirchstraße  
 53518 Adenau

Steuernr.: 01 116 31306  
 Datum: 24.07.2023

## Rechnung Nr. 1579

Leistungszeitraum: 03.07.2023 - 18.07.2023

Trockenbau-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten Kita Wershofenb

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	14,40	qm	Trockenbauwand, Porfile 75mm, 60mm Miwo Dämmung, 4* 12,5 mm GK Beplankung	58,00	835,20
2	24,00	Std.	Verkleidung von Stahlträgern mittels GK-Platten, Türöffnung mit GK/Miwo verschließen	49,50	1.188,00
3	1,00	Pauscha	Material zu voriger Position	500,00	500,00
4	10,00	Stunden	Stundenlohnarbeiten Wandflächen vorbereiten	49,50	495,00
5	213,57	qm	abgefräste Wandflächen grundieren	4,25	907,67
6	213,57	qm	Wandflächen mit Filzputz zweilagig verputzen, Filzputz auftragen, 2. Lage frisch in frisch auftragen und Oberfläche abfilzen	15,80	3.374,41
7	213,57	qm	Anstrich der Wandflächen mit Innensilikatfarbe	8,60	1.836,70
8	111,98	qm	Deckenflächen schleifen, grundieren und fleckspachteln	7,90	884,64
9	111,98	qm	Deckenflächen mit Rohfaser tapezieren und mit Dispersionsfarbe weiß streichen	13,50	1.511,73
10	117,50	qm	Zementestrich grundieren, spachteln und schleifen	11,50	1.351,25
11	117,50	qm	PVC Belag als Bahnenbelag liefern und verlegen. Belag: Mipolam-Troplan	44,20	5.193,50
12	84,00	lfdm	PVC Kernsockelleiste Höhe 60mm liefern und anbringen	8,40	705,60
<b>Zwischensumme</b>					<b>18.783,70</b>

Malerbetrieb Martin Möseler  
Burscheidsnück 6, 53520 Wershofen  
Tel. 02694-892 E-Mail: martin.moeseler@freenet.de, Handy 0163-3645265

Gesamt Netto		18.783,70
zzgl. 19,00 % USt. auf	18.783,70	3.568,90
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>22.352,60</b>

---

Bankverbindungen: Kreissparkasse Ahrweiler  
IBAN: DE09 5775 1310 0000 0220 04 IBAN:  
BIC: MALADE51AHR BIC:

Ihr Meisterbetrieb:

- ☑ Ladenbau
- ☑ Messebau
- ☑ Fenster und Türen

Bruno Gröner - Nordstraße 52 - 33520 Wershofen

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

Blatt 1

Kindergartenzweckverband  
Armutsbachtal  
Kirchstr.15-19

53518 Adenau

Wershofen, 10.08.2023

Rechnung per Mail

R2934

Ust-ID: DE 147922597


Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum.

Kunden Nr.:

Bestell Nr. Kunde

Lieferadresse: - Nordstr- 53520-Wershofen

Für ausgeführte Arbeiten berechnen wir Ihnen nachfolgend:

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
001	2 St	Zimmertüren mit Zarge liefern und einbauen. Türe Weißlack Beanspruchungsgruppe S, Rundkante, Röhrenspan, 198,5x98,5cm R Garant-Türe, BB Schloss, Bänder V0020 Zarge Weißlack Beanspruchungsgruppe S, 198,5x98,5x27cm RE Garant-Zarge, Rundkante, Bänder V3400	328,00	656,00
004	4 St	Drückergarnituren Rosettengarnitur KÖLN Rundrosette Edelstahl Matt U- Form liefern und einbauen	30,00	120,00
				
				
005	3 St	Fingerklemmschutz Athmer Schutzprofil BU-K+ Nebenschließkante / Bandseite der Türe liefern und anbringen.	58,00	174,00

Übertrag

EUR

950,00

Ihr Meisterbetrieb:

Ladenbau

Messebau


Fenster und Türen

Bruno Gröner - Nordstraße 52 - 53520 Werschhofen


Blatt 2

Rechnung per Mail R2934 für Kindergartenzweckverband vom 10.08.2023

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
		Übertrag	EUR	950,00



006	3 St	Fingerklemmschutz Athmer Fingerschutz® NR-25 für Gegenbandseite Silber Eloxiert	153,00	459,00
-----	------	--	--------	--------

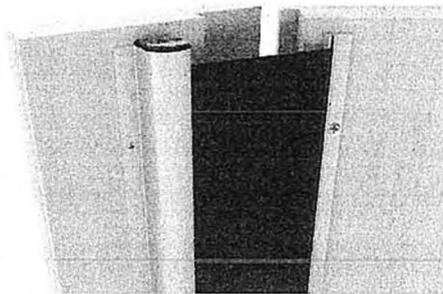

007	1 St	Dämpfer für Schiebetüre		25,00
-----	------	-------------------------	--	-------

Folgende Arbeiten nach Stundenverrechnungsstz durchgeführt:

- Wickelkomode ,Seitenwand abgeholt und einseitig neu lackiert.Wickelkomode wieder aufgebaut.
- Bei der Schiebetüre neuen Dämpfer eingebaut.  
Bodendichtung montiert, eingehangen und gangbar gemacht.
- Eingangstüre eingestellt.

008	6 St	Normalstunden Facharbeiter	42,00	252,00
-----	------	----------------------------	-------	--------

Nettobetrag	EUR	1.686,00
19% MwSt.		320,34
Endbetrag	EUR	2.006,34

Ihr Meisterbetrieb:

- ☑ Ladenbau
- ☑ Messebau
- ☑ Fenster und Türen



Bruno Gröner - Nordstraße 52 - 53520 Wershofen

Blatt 3

Rechnung per Mail R2934 für Kindergartenzweckverband vom 10.08.2023

Wir hoffen den Auftrag zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgeführt zu haben.  
Für weitere Fragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bruno Gröner

Ihr Meisterbetrieb:

- ☑ Ladenbau
- ☑ Messebau
- ☑ Fenster und Türen

Bruno Gröner - Nordstraße 52 - 53520 Wershofen

Blatt 1

Kindergartenzweckverband  
Armutsbachtal  
Kirchstr. 15-19

53518 Adenau

Wershofen, 12.10.2023

Rechnung per Mail

R2968

USt-ID: DE 147922597

Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum.

Kunden Nr.:

Bestell Nr. Kunde

Lieferadresse: - Nordstr- 53520-Wershofen

Für ausgeführte Arbeiten berechnen wir Ihnen nachfolgend:

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
001	1 St	Liefern und einbauen einer stumpfeinschlagenden Türe 71 x 198cm in die vorhandene Stahlzarge.  Mittellage ML Röhrenspan (TD ca. 40 mm Weißlack 9010 Kantenprofil KP Eckig Standard Schloss SC BB-Schloss Klasse 1 Dorn 55 mm Stulp 20/235 silberfarbig  Da die Bänder nicht mehr zu beschaffen sind ,würden wir die vorhandenen aus dem beschädigten Türen übernehmen.		223,00
002	1 St	Liefern und einbauen einer stumpfeinschlagenden Türe 945 x 198cm in die vorhandene Stahlzarge.  Mittellage ML Röhrenspan (TD ca. 40 mm Weißlack 9010 Kantenprofil KP Eckig Standard Schloss SC BB-Schloss Klasse 1 Dorn 55 mm Stulp 20/235 silberfarbig  Da die Bänder nicht mehr zu beschaffen sind ,würden wir die vorhandenen aus dem beschädigten Türen übernehmen.		223,00
003	3.5 St	Normalstunden für Facharbeiter: Wandschrank aufstellen	42,00	147,00
<b>Übertrag</b>			<b>EUR</b>	<b>593,00</b>

Ihr Meisterbetrieb:

- ☑ Ladenbau
- ☑ Messbau
- ☑ Fenster und Türen



Bruno Gröner - Nordstraße 52 • 53520 Wersbafen

Blatt 2

Rechnung per Mail R2968 für Kindergartenzweckverband vom 12.10.2023

Nettobetrag	EUR	593,00
19% MwSt.		112,67
Endbetrag	EUR	705,67

Zahlbar bis zum 19.10.2023 ohne Abzug.

Wir hoffen den Auftrag zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgeführt zu haben.  
Für weitere Fragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bruno Gröner

Eingegangen

10. Nov. 2023

Verbandsgemeinde Adenau

I II III IV V

<sup>2. FB 2</sup>  
**ORG-DELTA**  
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Zur Kenntnis genommen ✓

ORG-DELTA GmbH \* Friedrichstraße 10 \* D-73262 Reichenbach / Fils

Verbandsgemeinde Adenau  
Kirchstraße 15-19  
D-53518 Adenau



2020033940

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

**RECHNUNG 168227**

Datum: 08.11.2023  
Auftrags-Nr. 51256  
Innendienst: Herr Zayn-James Bühler  
Telefon: 07153 9826-16  
E-Mail: Akustik5@org-delta.de  
  
Außendienst: Herr Ronald Schäfer / B20  
Telefon: 0173 8708052  
E-Mail: Ronald.Schaefer@ad.org-delta.de  
Seite: 1 von 3

Ihre-Kundennummer : -- 221866

Kundentelefon :

Mobil :

Ihre-UStID-Nr. :

Fax :

E-Mail :

Ihre Bestellung per Mail am 28.09.2023

Ihre Angebotsanfrage an unseren Herrn Schäfer per Mail am 31.07.2023  
mit Erweiterung um Montage im September 23

Betrifft: Kita Wershofen

Raumakustische Maßnahmen für:

1) Bewegungsraum

2) Gruppenraum

3) Wickelraum

Absorber-Platte PET zum Kleben

Absorber-Platte M zum Kleben

Lieferung mit Montage

Lieferscheinnummer: 71664 / Leistungsmonat: 11/2023

Lieferadresse: Kita Wershofen • Nordstr. 25 • 53520 Wershofen

Pos.	Bezeichnung Artikel-Nr.	Menge	Einzelpreis zzgl. MwSt	Gesamtpreis zzgl. MwSt
------	----------------------------	-------	---------------------------	---------------------------

1) Bewegungsraum

2 **Absorber-Platte PET 1000x500x25 mm** 22,00 Stck 41,94 922,68

**17.BOS.PL.PET.1000.500.25.WEISS.**

zum Verkleben auf jeden tragbaren, haftbaren und glatten Untergrund  
(Decke und/oder Wand)

Hoch schallabsorbierendes Absorbermaterial aus 100% Polyesterfasern,  
beidseitig geglättet, unifarben weiß

Oberfläche 0,50 m<sup>2</sup>, Stärke 25mm

Produktklasse 1 nach Oeko-Tex Standard 100

Brandschutzklasse B1 – schwer entflammbar

ORG-DELTA GmbH  
Friedrichstraße 10  
73262 Reichenbach/Fils  
Telefon +49(0)71 53/98 26-0  
Telefax +49(0)71 53/98 26 98  
www.org-delta.de · info@org-delta.de

HRB Stuttgart 210518  
Geschäftsführerin: Anja Winter  
Steuer-Nr. 59350/00161  
UStId-Nr. DE145351464

Kreissparkasse Esslingen  
(BLZ 611 500 20)  
Konto-Nr. 30837016  
IBAN DE276 11 500 20 00 3083 70 16  
Swift Code (BIC) ESSLDE66  
Auslandszahlungen ausschließlich per SEPA-Überweisung

Volksbank Plochingen  
(BLZ 611 913 10)  
Konto-Nr. 609 887 009  
IBAN DE68 611 913 10 0609 887 009  
Swift Code (BIC) GENODE31VBP

**Kunden - Nr.: 221866**

Verbandsgemeinde Adenau

**RECHNUNG 168227**

Datum: 08.11.2023

Seite: 2 von 3

Pos.	Bezeichnung Artikel-Nr.	Menge	Einzelpreis zzgl. MwSt	Gesamtpreis zzgl. MwSt
3	<b>Montage-Kleber für Absorbermaterial - Kartusche</b> 17.EUR.BE.SIL.310ml. Für die Verwendung der Kartusche ist ein Auspress-Gerät notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)	6,00 Stck	6,39	38,34
<b>2) Gruppenraum</b>				
5	<b>Absorber-Platte M 1000 x 500 x 40 mm</b> 17.EUR.PL.1000.500.WEISS. zum Verkleben auf jeden tragbaren, haftbaren und glatten Untergrund (Decke und/oder Wand) oder zur Abhängung von der Decke mit Montagezubehör. Oberfläche 0,50 m <sup>2</sup> , glatt, mit Fase 20mm, Farbe weiß. Stärke 40mm.	24,00 Stck	32,49	779,76
6	<b>Montage-Kleber für Absorbermaterial - Kartusche</b> 17.EUR.BE.SIL.310ml. Für die Verwendung der Kartusche ist ein Auspress-Gerät notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)	6,00 Stck	6,39	38,34
<b>3) Wickelraum</b>				
8	<b>Absorber-Platte M 1000 x 500 x 40 mm</b> 17.EUR.PL.1000.500.WEISS. zum Verkleben auf jeden tragbaren, haftbaren und glatten Untergrund (Decke und/oder Wand) oder zur Abhängung von der Decke mit Montagezubehör. Oberfläche 0,50 m <sup>2</sup> , glatt, mit Fase 20mm, Farbe weiß. Stärke 40mm.	3,00 Stck	32,49	97,47
9	<b>Montage-Kleber für Absorbermaterial - Kartusche</b> 17.EUR.BE.SIL.310ml. Für die Verwendung der Kartusche ist ein Auspress-Gerät notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)	1,00 Stck	6,39	6,39
10	<b>Fracht- und Verpackungskosten</b> 17.Fracht.119.	1,00 Stck	119,00	119,00

**Kunden - Nr.: 221866**

Verbandsgemeinde Adenau

**RECHNUNG 168227**

Datum: 08.11.2023

Seite: 3 von 3

Pos.	Bezeichnung Artikel-Nr.	Menge	Einzelpreis zzgl. MwSt	Gesamtpreis zzgl. MwSt
11	Montagekosten 17.MON.	1,00 Stck	1.006,20	1.006,20
	<b>dazu gehört:</b>			
	<b>Anfahrtskosten - je Anfahrt</b> 17.Anfahrt. Montage durch unser erfahrenes Montageteam	1,00		
	<b>Rüstzeit</b> 17.OD.ME. Vor- und Nacharbeiten für die Montage dazu gehört: Vertragen vom Lagerort zum Montageplatz und Auspacken Vorbereitungen für die Befestigung der Produkte Aufräumarbeiten nach der Montage Entsorgung des Verpackungsmaterial	1,00		
	<b>Montagekosten Absorber-Platte pro Stück</b> 17.MO.PL.ST8.	49,00		

	Nettobetrag [EUR]	MwSt-Satz [%]	MwSt-Betrag [EUR]	Bruttobetrag [EUR]
	3.008,18	19,00	571,55	3.579,73
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>3.008,18</b>		<b>571,55</b>	<b>3.579,73</b>

Wir bitten um Zahlungseingang  
bis zum 22.11.2023 über EUR 3.579,73 netto.



# Baden-Württemberg

FINANZAMT ESSLINGEN

Finanzamt Esslingen, Postfach 100252, 73726 Esslingen

Firma  
Org-Delta GmbH z.Hd.Frau  
Anja Winter  
Friedrichstr 10  
73262 Reichenbach

Esslingen, 14.10.2022

Steuernummer: 28 59 350/00161

Länder-Nr.	FA-Nr.

Sicherheits-Nummer: 28 59 03050907

Länder-Nr. | FA-Nr.

## Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Firma/Herrn/Frau

Firma/Vorname, Name	Org-Delta GmbH z.Hd.Frau Anja Winter
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Friedrichstr 10, 73262 Reichenbach

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 EStG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 11.11.2022 bis zum 10.11.2025.

### Wichtiger Hinweis:

Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie auf einen bestimmten Auftrag lautet. Ist die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden. Das Original ist mit Dienstsiegel und Sicherheitsnummer versehen. Um eine Haftung für den Steuerabzug zu vermeiden, hat der Leistungsempfänger im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 EStG die Möglichkeit, die Richtigkeit der Freistellungsbescheinigung beim Bundeszentralamt für Steuern zu überprüfen. Das Bundeszentralamt für Steuern wird dem Leistungsempfänger im Wege einer elektronischen Abfrage Auskunft über die beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Freistellungsbescheinigungen erteilen (<http://www.bzst.de>). Dazu sollen die Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und bei einer elektronischen Abfrage den Leistungsempfängern bekannt gegeben werden. Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o.g. Gültigkeitszeitraumes und/oder für die o.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung gleich.

**Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.**

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig:



**Datenschutzhinweis:**

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter [www.finanzamt.de](http://www.finanzamt.de) (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Brandschutz- und Evakuierungsschulung  
 Externe Brandschutzbeauftragte  
 Flucht- und Rettungspläne/Feuerwehrpläne  
 Brandschutz-Abschottung  
 Wartung und Einbau von:  
 Brandschutz-Türen/Feststellanlagen  
 Wandhydranten  
 RWA-Anlagen  
 Gefahrenmeldesystem/Einbruchschutz  
 Rauchwarnmelder  
 Feuerlöscher



Mitglied im  
**bvbf**



Brandschutz Balter GmbH  
 Wilhelmstraße 37  
 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
 Tel 0 26 41 / 35 14 2  
 Fax 0 26 41 / 31 87 2  
 info@brandschutz-balter.de  
 www.brandschutz-balter.de

Verbandsgemeinde Adenau  
 für den Kindergartenzweckverband Armutshbachtal  
 Kirchstr. 15-19  
 D-53518 Adenau

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

Rechnungsnummer: 4427997  
*Bitte bei Rückfragen angeben!*  
 Rechnungsdatum: 27.01.2024  
 Kundennummer: 13465  
 Sachbearbeiter\*in: Balter-Burggraaff Ines  
 Seitenanzahl: 1 von 2

## Rechnung

Projekt Nr. 13590 / Verbandsgemeinde Adenau - Kirchstraße 15-19 - D-53518 Adenau

Lieferadresse: Kath. Kindertagesstätte St. Vincentius, Nordstr. 25, Wershofen  
 Leistungsdatum: 25.01.24

POSITION	MENGE	BEZEICHNUNG	EINZELPREIS (EUR)	GESAMT (EUR)
----------	-------	-------------	-------------------	--------------

Abgerechnet aus Projekt Nr.: 12531

Anschrift:  
 RM  
 Katholische KiTa gGmbH Koblenz Kath.  
 Kindertagesstätte St. Vincentius  
 Nordstr. 25  
 D 53520 Wershofen

Abgerechnet aus Lieferschein Nr.: 3311795  
 Belegdatum: 25.01.2024  
 Sachbearbeiter: Brückner Lukas

1,00	8,00 STK	<b>Art.-Nr.: 10310368</b>	29,15	233,20
------	----------	---------------------------	-------	--------

Ei650iW  
 10-Jahres-Rauchwarnmelder nach dem  
 Streulichtprinzip  
 mit fest eingebauter Lithiumbatterie,  
 AudioLINK-Funktion  
 funkvernetzbar  
 AudioLINK-Funktion zum Auslesen von  
 Melderdaten  
 Komfort-Identifikation  
 Diagnosefunktion  
 Ereignisspeicher  
 12h-Signalunterdrückung  
 großer Test-/Stummschaltknopf  
 anschwellende Testlautstärke  
 ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich  
 automatische Verschmutzungskompensation  
 Demontagesicherung  
 VdS-geprüft gemäß DIN EN 14604

Sofern nicht anders angegeben entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum.

KSK Ahrweiler, BIC: MALADE51AHR  
 DE82 5775 1310 0000 2613 47  
 Volksbank RheinAhrEifel, BIC: GENODED1BNA  
 DE96 5776 1591 0550 9930 00  
 Steuernummer: 01/665/02253  
 Geschäftsführer: Ines Balter-Burggraaff  
 Kay Burggraaff

POSITION	MENGE	BEZEICHNUNG	EINZELPREIS (EUR)	GESAMT (EUR)
		Qualitätssiegel Q gemäß VdS 3131/vfdb 14-01 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer		
2,00	8,00 STK	Art.-Nr.: 10311654 10-Jahres-Funkmodul Ei600MRF*	53,10	424,80
		Unabhängige Stromversorgung fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, mind. 10+1 Jahre Lebensdauer Werkzeuglose Montage Einstecken des Funkmoduls per Hand Hauscodierung zur störungsfreien Kommunikation mit allen Systemkomponenten Easy-Entry-Funktion erleichtert die Einbindung neuer Einheiten in bestehende Funksysteme Buddy-Missing-Funktion zeigt das Entfernen einer Einheit aus dem Funksystem an Geprüfte Qualität zertifiziert gem. VdS 3515 (G211009) 5 Jahre Garantie		
3,00	1,00 STK	Art.-Nr.: 9210026740 Montageeinheit inkl. Vernetzen und Funktionstest.	90,00	90,00
4,00	1,00 STK	Art.-Nr.: 9110016020 Fahrtkosten pauschal	12,00	12,00
5,00	1,00	Nach Absprache mit Frau Nolden zwei weitere RWM im Keller in den Gruppen installiert		

Endbetrag Netto EUR:	760,00
MwSt. gesamt:	144,40
Endbetrag Brutto EUR:	904,40

MwSt.-Nachweis:	Bemessungsgrundlage	MwSt %	MwSt. Betrag	Brutto
	760,00	19 %	144,40	904,40

Zahlungsbedingungen: Innerhalb 14 Tagen netto.

Sofern nicht anders angegeben entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum.

KSK Ahrweiler, BIC: MALADE51AHR  
DE82 5775 1310 0000 2613 47  
Volksbank RheinAhrEifel, BIC: GENODED1BNA  
DE96 5776 1591 0550 9930 00  
Steuernummer: 01/665/02253  
Geschäftsführer: Ines Balter-Burggraaff  
Kay Burggraaff

Brandschutz- und Evakuierungsschulung  
 Externe Brandschutzbeauftragte  
 Flucht- und Rettungspläne/Feuerwehrpläne  
 Brandschutz-Abschottung  
 Wartung und Einbau von:  
 Brandschutz-Türen/Feststellanlagen  
 Wandhydranten  
 RWA-Anlagen  
 Gefahrenmeldesystem/Einbruchschutz  
 Rauchwarnmelder  
 Feuerlöscher



Mitglied im  
**bvbf**



Brandschutz Balter GmbH  
 Wilhelmstraße 37  
 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
 Tel 0 26 41 / 35 14 2  
 Fax 0 26 41 / 31 87 2  
 info@brandschutz-balter.de  
 www.brandschutz-balter.de

Katholische KiTa gGmbH Koblenz  
 Kath. Kindertagesstätte St. Vincentius  
 Nordstr. 25  
 D-53520 Wershofen

Belegnummer:	3311795
<i>Bitte bei Rückfragen angeben!</i>	
Belegdatum:	25.01.2024
Kundennummer:	12585
Sachbearbeiter*in:	Brückner Lukas
Seitenanzahl:	1 von 2
Externe Belegnr.:	715
Datum:	25.01.2024

## Lieferschein

Abweichende Rechnungsadresse: Katholische KiTa gGmbH Koblenz  
 Göbelstr. 9-11  
 D-56727 Mayen

Projekt Nr. 12531 / RM  
 Katholische KiTa gGmbH Koblenz Kath. Kindertagesstätte St. Vincentius - Nordstr. 25 - D-53520 Wershofen

7 x Keller, 1 x Treppenhaus OG

POSITION	MENGE	BEZEICHNUNG
		Abgerufen aus Auftragsbestätigung Nr. 2201211 Belegdatum: 24.01.2024 Sachbearbeiter: Beier Christiane
1,00	8,00 STK	Art.-Nr.: 10310368 Ei650iW 10-Jahres-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip mit fest eingebauter Lithiumbatterie, AudioLINK-Funktion funkvernetzbar AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten Komfort-Identifikation Diagnosefunktion Ereignisspeicher 12h-Signalunterdrückung großer Test-/Stummschaltknopf anschwellende Testlautstärke ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich automatische Verschmutzungskompensation Demontagesicherung VdS-geprüft gemäß DIN EN 14604 Qualitätssiegel Q gemäß VdS 3131/vfdb 14-01 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer
2,00	8,00 STK	Art.-Nr.: 10311654 10-Jahres-Funkmodul Ei600MRF*

KSK Ahrweiler, BIC: MALADE51AHR  
 DE82 5775 1310 0000 2613 47  
 Volksbank RheinAhrEifel, BIC: GENODED1BNA  
 DE96 5776 1591 0550 9930 00  
 Steuernummer: 01/665/02253  
 Geschäftsführer: Ines Balter-Burggraaff  
 Kay Burggraaff

POSITION	MENGE	BEZEICHNUNG
		Unabhängige Stromversorgung fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, mind. 10+1 Jahre Lebensdauer Werkzeuglose Montage Einstecken des Funkmoduls per Hand Hauscodierung zur störungsfreien Kommunikation mit allen Systemkomponenten Easy-Entry-Funktion erleichtert die Einbindung neuer Einheiten in bestehende Funksysteme Buddy-Missing-Funktion zeigt das Entfernen einer Einheit aus dem Funksystem an Geprüfte Qualität zertifiziert gem. VdS 3515 (G211009) 5 Jahre Garantie
3,00	1,00 STK	Art.-Nr.: 9210026740 Montageeinheit inkl. Vernetzen und Funktionstest
4,00	1,00 STK	Art.-Nr.: 9110016020 Fahrtkosten pauschal
5,00	1,00	Nach Absprache mit Frau Nolden zwei weitere RWM im Keller in den Gruppen installiert

Ware angenommen:

25.01.2024

Datum

Fr Nolden

Name

Nolden

Unterschrift

Brückner Lukas

Name



Unterschrift Techniker\*in



# Elektrotechnik GmbH

Hauptstraße 47, 53520 Wershofen

2017  
koch-elektroteam  
@t-online.de

Elektrotechnik, Erdreichwärmepumpen, Sanitäreinrichtungen u. Verleih von Arbeitsbühnen

Koch Elektrotechnik, GmbH, Hauptstraße 47, 53520 Wershofen

Geschäftsführer: Karl-Heinz Koch

Kindergarten Zweckverband  
Armuthsbachtal  
Kirchstraße 15- 19

53518 Adenau

Tel. 02694-850  
Fax. 02694-852  
Mobil. 015118444401

Amtsgericht Koblenz  
Handelsreg. Nr.: B14765  
Ust-IdNr.: DE212536932  
Steuer Nr.: 01/661/00151

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

Datum	05.04.2023
Bearbeiter	K-H Koch
Kunden-Nr.	
<b>Nummer</b>	<b>R004517</b>

## Rechnung

Demontage und Installationsarbeiten im Untergeschoss des Kindergarten Wershofen.

Ausführungstermin: 30.03.2023 bis 03.04.2023

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
01.01	39,00 Stk.	Putzdeckel 60 bis 70mm	0,43	16,77
01.02	4,00 Stk.	Schalter- Schalterklemmdosen	1,36	5,44
01.03	7,30 m	NYIFY-J 3x1,5	2,20	16,06
01.04	1,00 Stk.	Klein und Befestigungsmat. wie: Gips, WAGO Steckklemmen, Stegleitungskleber, pauschal.	6,50	6,50
01.05	14,50 Std.	Monteurstunden zu Stundennachweis einschl. Rüstzeiten.	49,50	717,75
<b>Nettosumme in EUR</b>				762,52
zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf 762,52 EUR				144,88
<b>Endsumme in EUR</b>				<b>907,40</b>

Der Rechnungsbetrag (907,40 EUR) ist fällig bis zum 19.04.2023.

Bank: Raiffeisenbank Voreifel eG. Konto: BIC: GENODED1RBC IBAN: DE29 3706 9627 5832 0670 18

Bank: KSK Ahrweiler. Konto: BIC: MALADE51AHR IBAN: DE48 5775 1310 0000 214817

Koch Elektrotechnik GmbH, Hauptstraße 47, 53520 Wershofen Tel.02694-850 Fax.852

**Elektrotechnik, Erdreichwärmepumpen, Sanitäreinrichtungen u.Verleih von Arbeitsbühnen**


## Arbeitsbescheinigung

Kunde : Zweckverb. Armuthsbachtal		Baustelle : Kindergarten			
Straße :		Straße : Nordstraße			
Wohnort :		Ort : 53520 Wershofen			
Datum	Name	X	Art der Arbeit/Ort	Std.	km
30.03.2023	Koch		14:00 bis 17:00	3,0	
31.03.2023	Koch		9:00 bis 16:00 -1,0 Pause	6,0	
01.04.2023	Koch		9:00 bis 13:00	4,0	
03.04.2023	Koch		10:00 bis 11:30	1,5	
<b>X Erklärung : H= Helfer / Azubi, M= Monteur, OM= Obermonteur, Mei= Meister</b>				<b>Summe</b>	<b>14,5</b>

Art der Arbeit :	Auftrag erteilt von :
Demontage von zwei Leuchten Systemen, entfernen von Steckdosen und Schaltern.	
Absichern der offenen Leitungen mit Steckklemmen und verschlissen der Dosen mit Putzdeckel.	
Stemmen der Decken und Wandschlitz e einschlieslich verlegen der Kabel sowie setzen der Schalterdose.	
03.04.23 verkleben der Stegleitung im Deckenschlitz.	

Stk./m	Material
39,0 Stk.	Putzdeckel 60 bis 70mm
4,0 Stk.	Schalter/ Schalterklemmdosen
7,30 m	Stegleitung 3x1,5
1,0 Stk.	Klemmen, Kleber, Gips

Die oben angeführten Arbeiten wurden ausgeführt.



Unterschrift des Monteurs

Ich bestätige den Materialverbrauch und die Stundenleistung und bin mit der Berechnung einverstanden.

Datum : \_\_\_\_\_ Unterschrift des Kunden :



Rechnerisch geprüft ✓

# Elektrotechnik GmbH

Hauptstraße 47, 53520 Wershofen

koch-elektroteam  
@t-online.de

Elektrotechnik, Erdreichwärmepumpen, Sanitäreinrichtungen u. Verleih von Arbeitsbühnen

Koch Elektrotechnik, GmbH, Hauptstraße 47, 53520 Wershofen

Geschäftsführer: Karl-Heinz Koch

Kindergarten Zweckverband  
Armuthsbachtal  
Kirchstraße 15- 19

53518 Adenau

Tel. 02694-850  
Fax. 02694-852  
Mobil. 015118444401Amtsgericht Koblenz  
Handelsreg. Nr.: B14765  
Ust-IdNr.: DE212536932  
Steuer Nr.: 01/661/00151

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

Datum	03.09.2023
Bearbeiter	K-H Koch
Kunden-Nr.	
Nummer	R004540

## Rechnung

Lieferung von LED Leuchten für die Gruppenräume im Untergeschoß  
des Kindergarten Wershofen.

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
01.01	13,00 Stk.	Philips LED- Anbauleuchte 4000K, 34W, ohne Dimmerfunktion.	124,15	1.613,95
01.02	1,00 Stk.	RZB LED- Deckenleuchte 4000K, ohne Dimmerfunktion.	106,02	106,02
01.03	1,00 Stk.	Wandleuchte GRANDO weiß, 4000K, ohne Dimmerfunktion	54,00	54,00
<b>Nettosumme in EUR</b>				1.773,97
zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf 1.773,97 EUR				337,05
<b>Endsumme in EUR</b>				2.111,02

Bei Zahlung bis zum 10.09.2023 bezahlen Sie nur 2.068,80 EUR.  
Dies entspricht 2 % auf Material und Lohn = 42,22 EUR auf 2.111,02 EUR.  
Oder Sie bezahlen 2.111,02 EUR bis zum 17.09.2023.

Bank: Raiffeisenbank Voreifel eG. Konto: BIC: GENODED1RBC IBAN: DE29 3706 9627 5832 0670 18

Bank: KSK Ahrweiler. Konto: BIC: MALADE51AHR IBAN: DE48 5775 1310 0000 214817



# Elektrotechnik GmbH

Hauptstraße 47, 53520 Wershofen

koch-elektroteam  
@t-online.de

Elektrotechnik, Erdreichwärmepumpen, Sanitäreinrichtungen u. Verleih von Arbeitsbühnen

Koch Elektrotechnik, GmbH, Hauptstraße 47, 53520 Wershofen

Geschäftsführer: Karl-Heinz Koch

Kindergarten Zweckverband  
Armuthsbachtal  
Kirchstraße 15- 19

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

53518 Adenau

Tel. 02694-850  
Fax. 02694-852  
Mobil. 015118444401

Amtsgericht Koblenz  
Handelsreg. Nr.: B14765  
Ust-IdNr.: DE212536932  
Steuer Nr.: 01/661/00151

Datum	19.09.2023
Bearbeiter	K-H Koch
Kunden-Nr.	
Nummer	R004542

## Rechnung

Lampenmontage und Installationsarbeiten im Kindergarten Wershofen.  
Ausführungszeitraum: 19.07.2023 bis 15.09.2023

Schaltermaterialien: Busch-Jaeger, Reflex SI, weiß

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
01.01	13,00 Stk.	Abzweigdosendeckel 70mm	0,98	12,74
01.02	7,00 Stk.	1-fach Rahmen	2,55	17,85
01.03	6,00 Stk.	2-fach Rahmen	3,98	23,88
01.04	1,00 Stk.	3-fach Rahmen	7,76	7,76
01.05	1,00 Stk.	4-fach Rahmen	12,09	12,09
01.06	12,00 Stk.	Schalterwippen	3,19	38,28
01.07	4,00 Stk.	Schuko-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz	7,83	31,32
01.08	3,00 Stk.	Tastereinsatz	8,96	26,88
01.09	14,00 Stk.	Aus/ Wechselschalter	7,95	111,30
01.10	1,00 Stk.	Kontrollschalter	20,62	20,62
01.11	1,00 Stk.	Kontrollschalterwippe	4,23	4,23
01.12	15,00 m	H03VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup> , weiß	0,86	12,90
01.13	1,00 Stk.	Klemm und Befestigungsmat. pauschal	15,00	15,00

Bank: Raiffeisenbank Voreifel eG. Konto: BIC: GENODED1RBC IBAN: DE29 3706 9627 5832 0670 18

Bank: KSK Ahrweiler. Konto: BIC: MALADE51AHR IBAN: DE48 5775 1310 0000 214817

**Rechnung**  
Kindergarten Zweckverband  
Armutshbachtal

Nummer **R004542**  
Datum 19.09.2023  
Seite 2

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
		Übertrag:		334,85
01.14	22,50 Std.	Montage und Installationsarbeiten zum Stundennachweiß, einschl. fahrt und Rüstzeiten.	55,50	1.248,75
		<b>Nettosumme in EUR</b>		<u>1.583,60</u>
		zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf 1.583,60 EUR		<u>300,88</u>
		<b>Endsumme in EUR</b>		<u><u>1.884,48</u></u>

Bei Zahlung bis zum 26.09.2023 bezahlen Sie nur 1.846,79 EUR.  
Dies entspricht 2 % auf Material und Lohn = 37,69 EUR auf 1.884,48 EUR.  
Oder Sie bezahlen 1.884,48 EUR bis zum 03.10.2023.

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

Koch Elektrotechnik GmbH, Hauptstraße 47, 53520 Wershofen Tel.02694-850 Fax.852

Elektrotechnik, Erdreichwärmepumpen, Sanitäreinrichtungen u.Verleih von Arbeitsbühnen


## Arbeitsbescheinigung

Kunde : Zweckverb. Armuthsbachtal		Baustelle : Kindergarten			
Straße :		Straße : Nordstraße			
Wohnort :		Ort : 53520 Wershofen			
Datum	Name	X	Art der Arbeit/Ort	Std.	km
14.09.2023	Koch		8:30 bis 16:30 -1,0Pause	7,0	
15.09.2023	Koch		8:30 bis 10:30	2,0	
X Erklärung : H= Helfer / Azubi, M= Monteur, OM= Obermonteur, Mei= Meister				Summe	9,0

Art der Arbeit :	Auftrag erteilt von :
14.09.2023 Raum 2, Lampenmontage, restlichen Schalter und Steckdosen montiert.	
15.09.2023 Restarbeiten wie 14.09.23 und Ventilator geprüft ( defekt ).	
Prüfung der Räume und Flur.	

Stk./m	Material
1,0	Klemm und Befestigungsmat.
15,0 m	H07V-K 3x1,5 mm <sup>2</sup> weiß

Die oben angeführten Arbeiten wurden ausgeführt.



Ich bestätige den Materialverbrauch und die Stundenleistung und bin mit der Berechnung einverstanden.

Datum : \_\_\_\_\_ Unterschrift des Kunden : \_\_\_\_\_

Unterschrift des Monteurs

Koch Elektrotechnik GmbH, Hauptstraße 47, 53520 Wershofen Tel.02694-850 Fax.852

Elektrotechnik, Erdreichwärmepumpen, Sanitäreinrichtungen u.Verleih von Arbeitsbühnen

## Arbeitsbescheinigung

Kunde : Zweckverb. Armuthsbachtal		Baustelle : Kindergarten			
Straße :		Straße : Nordstraße			
Wohnort :		Ort : 53520 Wershofen			
Datum	Name	X	Art der Arbeit/Ort	Std.	km
19.07.2023	Koch		16:00 bis 17:00 Dosen frei gemacht u. gesäubert	1,0	
27.07.2023	Koch		9:30 bis 10:30 nutzbare Steckd. u. Rahmen gesäubert	1,0	
29.07.2023	Koch		8:00 bis 12:00 Steckdosen montiert	4,0	
23.08.2023	Koch		16:30 bis 18:00	1,5	
25.08.2023	Koch		9:30 bis 16:30 -1,0 Pause	6,0	
X Erklärung : H= Helfer / Azubi, M= Monteur, OM= Obermonteur, Mei= Meister				Summe	13,5

Art der Arbeit : Auftrag erteilt von :

23.08.2023 LED Wandlampe angebracht, Abzweigdosen geschlossen und Rahmen angebracht.

25.08.2023 Raum 01 Deckenleuchten angebracht, Schalter Tür verklemt und montiert.

Stk./m	Material
13,0	Abzweigdosendeckel 70mm
7,0	BJ 1 fach Rahmen
6,0	BJ 2 fach Rahmen
1,0	BJ 3 fach Rahmen
1,0	BJ 4 fach Rahmen
12,0	BJ Schalterwippen
4,0	BJ Steckdosen mit Kindersicherung
3,0	BJ Taster- Einsatz
14,0	BJ Aus/ Wechselschalter- Einsatz
1,0	BJ Kontrollschalter- Einsatz
1,0	BJ Kontrollschalter- Wippe

Die oben angeführten Arbeiten wurden ausgeführt.

Ich bestätige den Materialverbrauch und die Stundenleistung und bin mit der Berechnung einverstanden.

Unterschrift des Monteurs

Datum : Unterschrift des Kunden :



A. HBA  
2. FB2

**Eingegangen**  
17. Okt. 2023  
Verbandsgemeinde Adenau

I	II	III	IV	V
---	----	-----	----	---

Krämer Haustechnik

Hauptstraße 92  
53520 Wershofen

Steuernummer: 01/093/30867

026941372  
016094566867  
svenkraemer@online.de  
Fax: 026943374994

Rechnungsnummer: 1758  
Kundennummer: K1044  
Rechnungsdatum: 05.10.2023

Krämer Haustechnik · Hauptstraße 92 · 53520 Wershofen  
Ortsgemeinde Wershofen  
Nordstraße 17  
53520 Wershofen

Leistungsdatum: 28.07.2023

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

## RECHNUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zur Kenntnis genommen ✓

Sachlich geprüft ✓

anbei erhalten Sie eine Rechnung für unsere Dienstleistungen.  
Installation der Heizkörper im Kindergarten Wershofen.

Position	Faktor	Preis	Betrag
Optima T. Profil-Universalheizkoerper Typ 22, BH 600 mm, BL 1400 mm RAL 9016	5,00	273,10 €	1.365,50 €
Optima T Zweirohr-Anschlussblock 3/4" Durchgang, MS vern.u.a.fuer Kermi/Brugman	5,00	10,97 €	54,85 €
Thermostatkopf HEIMEIER K 6000-00.500 mit eingebautem Fuehler, weiss	5,00	14,07 €	70,35 €
Optima T Klemmverschraubung. SpeedFix 15 mm G3/4", Euroko.komp., 2-er Set, UBA-konf.	5,00	6,73 €	33,65 €
T-Stueck PROFIPRESS 2418, 15mm, 291952 aus Kupfer	10,00	3,72 €	37,20 €
Bogen PROFIPRESS 2416 15mm	40,00	2,88 €	115,20 €
Kupferrohr 15x1,0 mm in Stangen, Sanco	30,00	8,87 €	266,10 €
Befestigungsmaterial	1,00	50,00 €	50,00 €
Arbeitszeit	12,00	42,00 €	504,00 €
		NETTOBETRAG	2.496,85 €
		STEUERSATZ	19,00 %
		UMSATZSTEUER	474,40 €
		<b>SUMME</b>	<b>2.971,25 €</b>

Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 14 Tagen auf unser Konto.

Firma:  
Krämer Haustechnik  
Steuernummer  
01/093/30867

Anschrift  
Hauptstraße 92  
53520 Wershofen  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon 026941372  
Mobil 016094566867  
E-Mail svenkraemer@online.de  
Fax 026943374994

Bankverbindung:  
Sven Krämer  
IBAN: DE32370696275835890025  
BIC: GENODE33  
Raiffeisenbank Voreifel eG

Mit freundlichen Grüßen

**Firma:**

Krämer Haustechnik  
Steuernummer  
01/093/30867

**Anschrift**

Hauptstraße 92  
53520 Wershofen  
Deutschland

**Kontakt:**

Telefon 026941372  
Mobil 016094566867  
E-Mail [svenkraemer@online.de](mailto:svenkraemer@online.de)  
Fax 026943374994

**Bankverbindung:**

Sven Krämer  
IBAN:DE32370696275835890025  
BIC:GENODE33RBC  
Raiffeisenbank Voreifel eG

1. OG Wershofen ✓  
2. FB2



# BZR - INSTITUT

Baustoffberatungszentrum Rheinland

Baustoffberatungszentrum Rheinland, Siebenmorgenweg 2-4, 53229 Bonn

Verbandsgemeindeverwaltung Adenau  
Fachbereich Planen und Bauen  
Kirchstraße 15-19  
53518 Adenau

Ingenieur- und Sachverständigenbüro

Chemische und physikalische Forschungs-  
und Prüflaboratorien für Bau- und  
Werkstoffkunde

Tel.: 0228/469589  
Fax: 0228/471497  
E-Mail: info@bzs-institut.de  
Web: www.bzs-institut.de



2020020094

Auftraggeber Kindergartenzweckverband Armuthsbachtal

**Eingegangen**  
**03. Mai 2022**  
Verbandsgemeinde Adenau  
I II III IV V

## RECHNUNG

Belegnummer 4002466  
Datum 29.04.2022  
Kunden-Nr. 10403  
Lieferdatum 29.04.2022  
Unser Zeichen VMS/KH-27263

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

**BV: Kindergarten Wershofen, Nordstr. 25**  
**Raumluftmessungen auf Schimmelpilze**


Pos	Leistung	Menge / Einheit	Einzelpreis €	Betrag €
1	Ortstermin zur Inaugenscheinnahme und Probenentnahme am 06.04.2022 incl. An- und Abfahrt sowie Vor- und Nachbereitung des Ortstermins	2 Std.	95,00	190,00
2	Mikrobielle Luftanalyse auf Schimmelpilze incl. Differenzierung der Schimmelpilze	4 Stück	195,00	780,00
3	Auswertung und Bericht incl. Nebenkosten	1 Stück	100,00	100,00
Zwischensumme				1.070,00
19 % USt. auf € 1.070,00				203,30
<b>Endbetrag</b>				<b>1.273,30</b>

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

Zahlung:  
Ohne Abzug bis zum 27.05.2022

1. Bankverbindung IBAN: DE51 3806 0186 0301 8010 17, BIC: GENODED1 BRS (Volksbank Köln Bonn e.G.)  
2. Bankverbindung IBAN: DE58 3705 0299 0000 0159 56, BIC: COKSDE33 (Kreisbank Köln)

Inhaber: Volker Schubert \* Steuer-Nr.: 206/5301/2632 \* Gerichtsstand: Bonn

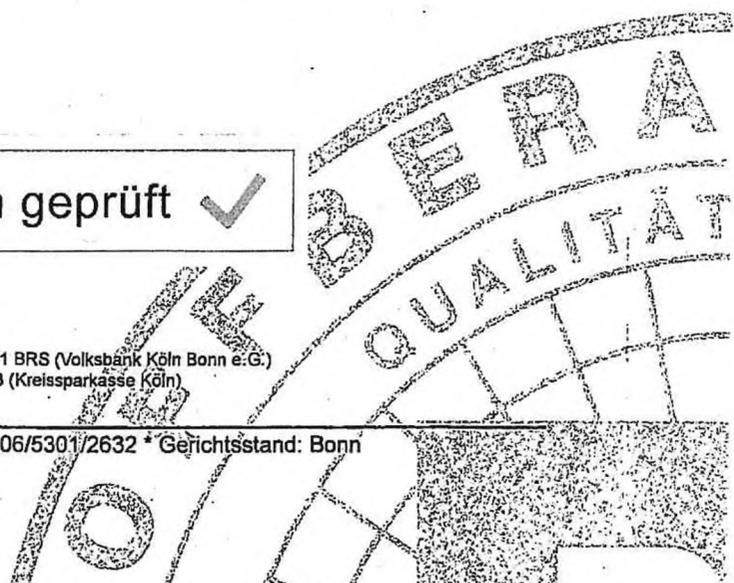



1. OG Wershofen v  
~~I. Begeordneter~~  
2. FB 2

# BZR - INSTITUT

Baustoffberatungszentrum Rheinland

Baustoffberatungszentrum Rheinland, Siebenmorgenweg 2-4, 53229 Bonn

Verbandsgemeindeverwaltung Adenau  
Fachbereich Planen und Bauen  
Kirchstraße 15-19  
53518 Adenau

Ingenieur- und Sachverständigenbüro

Chemische und physikalische Forschungs-  
und Prüflaboratorien für Bau- und  
Werkstoffkunde

Tel.: 0228/469589  
Fax: 0228/471497  
E-Mail: info@bzs-institut.de  
Web: www.bzs-institut.de



2020021557

**Eingegangen**  
15. Juli 2022  
Verbandsgemeinde Adenau  
II III IV V

## RECHNUNG

Belegnummer 4002803  
Datum 12.07.2022  
Kunden-Nr. 10403  
Lieferdatum 12.07.2022  
Unser Zeichen VMS/GS-27657

**Objekt: Kindergarten Wershofen, Nordstraße 25, Wershofen - Souterrain**  
**Raumluftmessungen auf Schimmelpilze, Gesamtsporen und Abklatschproben**

Pos	Leistung	Menge / Einheit	Einzelpreis €	Betrag €
1	Ortstermin zur Inaugenscheinnahme und Probenentnahme am 14.06.2022 incl. An- und Abfahrts und Vor- und Nachbereitung des Ortstermins	2 Std.	95,00	190,00
2	Mikrobielle Luftanalyse auf Schimmelpilze incl. Differenzierung der Schimmelpilze	3 Stück	195,00	585,00
3	Mikrobielle Luftanalyse auf Schimmelpilze auf Gesamtsporen	4 Stück	115,00	460,00
4	Mikrobielle Analyse auf Schimmel (Abklatschproben)	10 Stück	95,00	950,00
5	Auswertung und Bericht incl. Nebenkosten	1 Stück	200,00	200,00
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.385,00</b>
<b>19 % USt. auf € 2.385,00</b>				<b>453,15</b>
<b>Endbetrag</b>				<b>2.838,15</b>

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓

Rechnerisch geprüft ✓

Zahlung:  
Ohne Abzug bis zum 09.08.2022

1. Bankverbindung IBAN: DE51 3806 0186 0301 8010 17, BIC: GENODED1 BRS (Volksbank Köln Bonn e.G.)  
2. Bankverbindung IBAN: DE58 3705 0299 0000 0159 56, BIC: COKSDE33 (Kreissparkasse Köln)

Inhaber: Volker Schubert \* Steuer-Nr.: 206/5301/2632 \* Gerichtsstand: Bonn

Sachlich und rechnerisch geprüft ✓



Eingegangen FB2

28. Feb. 2023

Verbandsgemeinde Adenau  
**BZR - INSTITUT**  
Baustoffberatungszentrum Rheinland

Baustoffberatungszentrum Rheinland, Stebenmorgenweg 2-4, 53229 Bonn

*Kita Zweckverband Armutshachtal*  
~~Verbandsgemeindeverwaltung Adenau~~  
Fachbereich Planen und Bauen  
Kirchstraße 15-19  
53518 Adenau

Ingenieur- und Sachverständigenbüro

Chemische und physikalische Forschungs-  
und Prüflaboratorien für Bau- und  
Werkstoffkunde

Tel.: 0228/469589  
Fax: 0228/471497  
E-Mail: info@bzt-institut.de  
Web: www.bzt-institut.de



2020025254

Eingegangen

27. Feb. 2023

Verbandsgemeinde Adenau

I	II	III	IV	V
---	----	-----	----	---

**RECHNUNG**

Belegnummer 4003902  
Datum 24.02.2023  
Kunden-Nr. 10403  
Lieferdatum 24.02.2023  
Unser Zeichen VMS/GS-28791

**Objekt: Kindergarten Wershofen, Nordstraße 25, Wershofen - Souterrain**  
**Raumluftmessungen auf Schimmelpilze, Gesamtsporen und Abklatschproben**

Pos	Leistung	Menge / Einheit	Einzelpreis €	Betrag €
1	Ortstermin zur Inaugenscheinnahme und Probenentnahme am 06.02.2023 incl. An- und Abfahrts und Vor- und Nachbereitung des Ortstermins	2 Std.	95,00	190,00
2	Mikrobielle Luftanalyse auf Schimmelpilze incl. Differenzierung der Schimmelpilze	3 Stück	195,00	585,00
3	Mikrobielle Luftanalyse auf Schimmelpilze auf Gesamtsporen	4 Stück	115,00	460,00
4	Mikrobielle Analyse auf Schimmel (Abklatschproben)	10 Stück	95,00	950,00
5	Auswertung und Bericht incl. Nebenkosten	1 Stück	200,00	200,00
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.385,00</b>
19 % USt. auf € 2.385,00				453,15
<b>Endbetrag</b>				<b>2.838,15</b>

Zahlung:  
Ohne Abzug bis zum 24.03.2023

1. Bankverbindung IBAN: DE51 3806 0186 0301 8010 17, BIC: GENODED1 BRS (Volksbank Köln Bonn e.G.)  
2. Bankverbindung IBAN: DE58 3705 0299 0000 0159 56, BIC: COKSDE33 (Kreissparkasse Köln)

Inhaber: Volker Schubert \* Steuer-Nr.: 206/5301/2632 \* Gerichtsstand: Bonn
