


Übersicht gestellter Förderanträge der Kreisverwaltung

Maßnahmenkategorie	Kosten lt. Maßnahmenplan	tatsächliche Kosten bis Stichtag	Beantragte Fördersumme	Bewilligte Fördersumme	Abgerufene Fördersumme	Erhaltene Fördersumme
Allgemeine kommunale Infrastruktur (AKI)	410.201.966,81 €	307.880.774,60 €	358.455.005,08 €	334.610.336,36 €	289.405.511,20 €	285.273.617,29 €
Wasser und Abfall (WA)	1.100.000,00 €	1.081.000,00 €	262.000,00 €	251.300,00 €	251.300,00 €	251.300,00 €
Hochwasserschutzanlagen und Wasserläufe (HuW)	233.273.487,90 €	4.963.330,18 €	32.216.265,00 €	11.927.518,00 €	3.895.863,88 €	3.416.899,88 €
Telekommunikationsinfrastruktur (TK)	- €					
Gesamtsumme	644.575.454,71 €	313.925.104,78 €	390.933.270,08 €	346.789.154,36 €	293.552.675,08 €	288.941.817,17 €

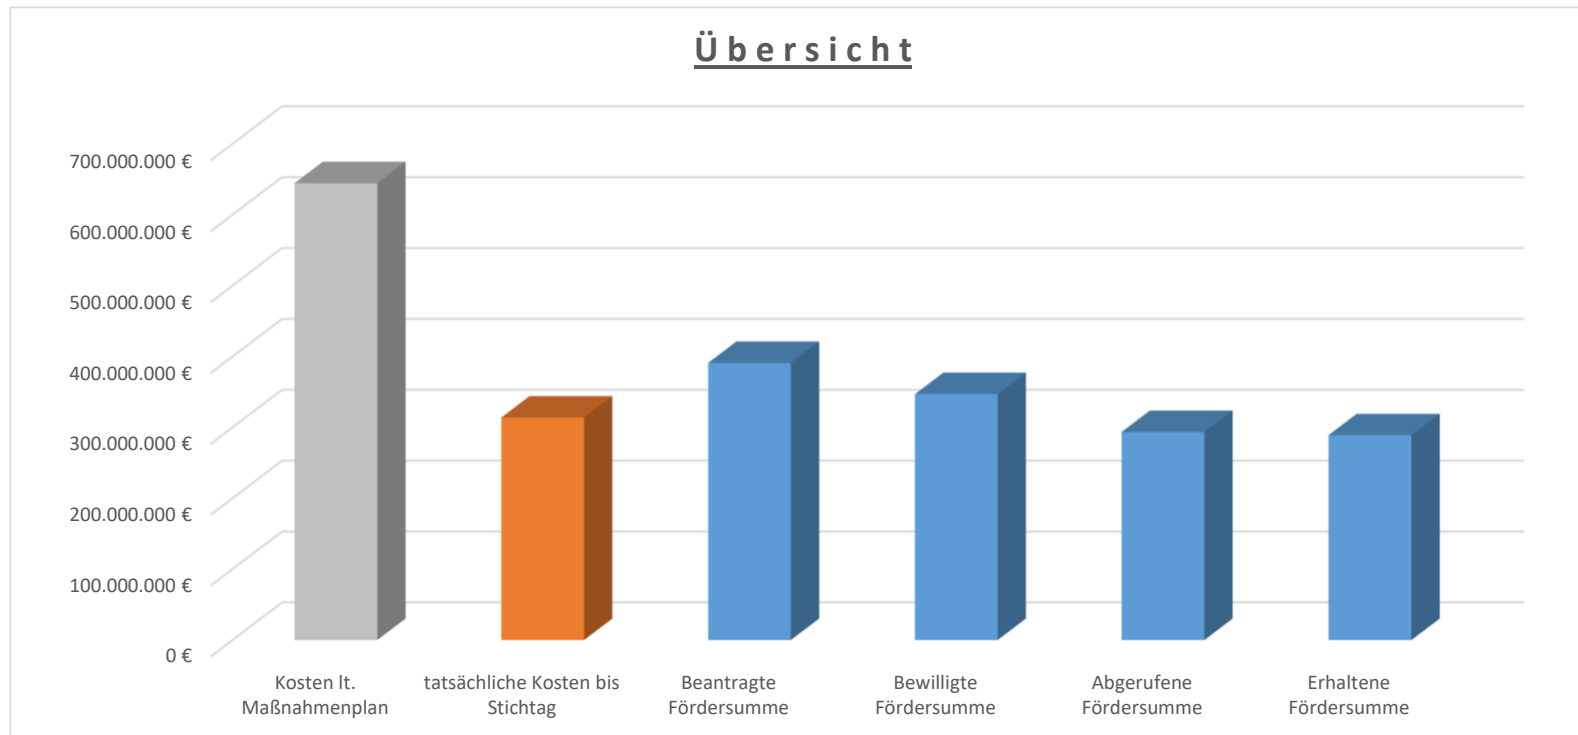

Amtlicher Gemeindegchlüssel	Teilplan	lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Aufbaumaßnahme in wenigen Stichworten	Abteilung	Sachstand	Erwartete zuwendungsfähige Gesamtkosten lt. Maßnahmenplan	bereits entstandene Kosten	Antrag gestellt am	Beantragte Summe	Bewilligungsbescheid vom	Bewilligte Summe	Höhe Mittelabruf	Erhaltene Summe
13100000	Akl	1	Temporäres Wärmenetz	Mehrere mobile Heizkörper bildeten ein temporäres Nahwärmenetz	Abt. 1.4	abgeschlossen	1.163.384,00 €	1.454.230,47 €	27.12.2021 / 09.06.2023	1.454.230,47 €	11.10.2023	980.286,54 €	980.286,54 €	980.286,54 €
13100000	Akl	4	Übergangsstandort Phillip Freiherr von Boeselager Realschule Plus	Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs	ESG	in Umsetzung	1.250.000,00 €	1.919.906,80 €	10.04.2024	1.453.931,57 €	05.07.2024	1.453.931,57 €	1.453.931,57 €	1.453.931,57 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	244.597,27 €	13.08.2024	244.597,27 €	244.597,27 €	244.597,27 €
13100000	Akl	5	Übergangsstandort AreGymnasium am Ersatzstandort in Grafschaft	Stellung von Containern für Klassen, Sport, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs	ESG	in Umsetzung	11.000.000,00 €	9.649.783,59 €	29.09.2023	3.501.757,65 €	05.07.2024	3.501.226,79 €	3.501.226,79 €	3.501.226,79 €
				2. Folgeantrag	ESG				10.04.2024	5.877.628,26 €	05.07.2024	5.877.628,26 €	5.877.628,26 €	5.877.628,26 €
				3. Folgeantrag	ESG				30.04.2024	308.498,28 €	05.07.2024	308.498,28 €	308.498,28 €	308.498,28 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	1.528.639,77 €				
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	1.717.578,12 €	17.08.2024	1.114.928,21 €	1.114.928,21 €	1.114.928,21 €
13100000	Akl	6	Übergangsstandort Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler	Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager zur Sicherstellung des Schulbetriebs	ESG	in Umsetzung	350.000,00 €	865.080,56 €	10.04.2024	971.237,72 €	05.07.2024	910.907,54 €	910.907,54 €	910.907,54 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	96.111,07 €	14.08.2024	86.805,45 €	86.805,45 €	86.805,45 €
13100000	Akl	7	Übergangsstandort Don-Bosco-Schule an den kurzfristigen Ersatzstandorten in Sinzig und Burgbrohl sowie am Mittelfristigen Ersatzstandort in Ahrweiler	Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstücks-pacht zur Sicherstellung des Schulbetriebs	ESG	in Umsetzung	5.000.000,00 €	7.285.690,84 €	10.04.2024	6.052.680,90 €	05.07.2024	5.998.458,75 €	5.998.458,75 €	5.998.458,75 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	777.462,08 €	15.08.2024	489.769,01 €	489.769,01 €	489.769,01 €
13100000	Akl	8	Übergangsstandort Levana-Schule	Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstücks-pacht zur Sicherstellung des Schulbetriebs	ESG	in Umsetzung	6.000.000,00 €	4.220.601,27 €	10.04.2024	4.940.293,30 €	05.07.2024	4.916.371,54 €	4.916.371,54 €	4.916.371,54 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	689.393,28 €	15.08.2024	427.357,91 €	427.357,91 €	427.357,91 €
13100000	Akl	9	Übergangsstandort Berufsbildende Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler	Stellung von Containern für Klassen, Verwaltung, Toiletten, Hausmeister und Lager sowie Grundstücks-pacht zur Sicherstellung des Schulbetriebs	ESG	in Umsetzung	11.700.000,00 €	10.647.387,49 €	10.04.2024	11.559.765,88 €	05.07.2024	11.559.765,88 €	11.559.765,88 €	11.559.765,88 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	865.842,21 €	16.08.2024	416.412,99 €	416.412,99 €	416.412,99 €
13100000	Akl	10	Sanierung Phillip Freiherr von Boeselager Realschule Plus	Neuaufbau der Untergeschosse mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, Außengelände, Sporthalle etc..	ESG	in Umsetzung	10.531.406,25 €	2.204.267,15 €	28.09.2023	10.531.406,25 €	15.05.2024	9.076.885,48 €	2.723.065,64 €	2.723.065,64 €
13100000	Akl	11	Sanierung Don-Bosco-Schule	Neuaufbau der Untergeschosse mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, Außengelände, Sporthalle etc..	ESG	in Planung	6.717.156,25 €	23.906,57 €						
13100000	Akl	12	Sanierung Levana-Schule	Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Bewegungsbad inkl. Technik, Einrichtung, etc..	ESG	in Planung	5.671.315,56 €	14.860,42 €						
13100000	Akl	13	Sanierung Are-Gymnasium	Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthallen	ESG	in Umsetzung	13.649.093,75 €	1.353.844,97 €	28.09.2023	13.649.093,75 €	15.05.2024	11.783.093,66 €	3.534.928,10 €	3.534.928,10 €
13100000	Akl	14	Sanierung Peter-Joerres-Gymnasium	Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthalle	ESG	in Umsetzung	9.510.793,75 €	3.491.143,68 €	28.09.2023	8.875.793,75 €	15.05.2024	7.493.516,05 €	2.248.054,82 €	2.248.054,82 €
13100000	Akl	15	Sanierung Rhein-Gymnasium	Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Lüftung, Einrichtung, etc. sowie der Sporthallen	ESG	in Umsetzung	6.009.131,25 €	1.221.681,16 €	29.09.2023	6.009.131,25 €	15.05.2024	4.588.641,61 €	1.376.592,48 €	1.376.592,48 €
13100000	Akl	16	Sanierung Berufsbildende Schule	Neuaufbau von UG mit Werkstätten mit Elektrik, IT, Heizung, Außengelände, Lüftung, Travo, Einrichtung, Hausmeisterwohnungen etc. sowie der Sporthalle. Neubau von Ersatzgebäuden für die abgerissenen Pavillons.	ESG	in Umsetzung	30.660.093,75 €	3.395.297,64 €	29.09.2023	30.660.093,75 €	15.05.2024	26.575.957,96 €	7.972.787,31 €	7.972.787,31 €
13100000	Akl	17	Ersatzbeschaffung von mobilen Gegenständen des Schulvermögens	Ersatzbeschaffung von mobilen Gegenständen des Schulvermögens.	ESG	in Umsetzung	20.000.000,00 €	7.077.179,60 €	28.09.2023	3.204.606,63 €	25.01.2024	3.204.606,63 €	3.204.606,63 €	3.204.606,63 €

				2. Folgeantrag	ESG				30.04.2024	3.019.320,79 €	27.05.2024	2.982.754,47 €	2.982.754,47 €	2.982.754,47 €
13100000	Akl	18	Wiederherrichtung von Archivunterlagen in Schulen	Archivgegenstände, Zeugnisse usw. müssen behandelt und wiederhergestellt werden.	ESG	in Planung	150.000,00 €	25.048,06 €						
13100000	Akl	19	Zukunftskonferenz für den Wiederaufbau des Ahrtals	Vernetzung der für den Wiederaufbau zuständigen Institutionen sowie Ideenfindung und Maßnahmenplanung für den Wiederaufbau	Abt. 1.3	abgeschlossen	21.556,28 €	21.556,28 €	30.05.2022	21.556,28 €	Jul 22	21.556,28 €	21.556,28 €	21.556,28 €
13100000	Akl	23	Moderation des Wiederaufbaus der Sportstätten	Welche Sportstätten wo und in welchem Umfang wieder aufgebaut werden, wird vom Sportbund Rheinland moderiert und begleitet	Abt. 4.6	abgeschlossen	79.968,00 €	79.968,00 €	26.09.2022	79.968,00 €	08.12.2022	79.968,00 €	79.968,00 €	79.968,00 €
				Mehrkostenantrag	Abt. 4.6	abgeschlossen	14.518,00 €	14.518,00 €	30.03.2023	14.518,00 €	13.06.2023	14.518,00 €	14.518,00 €	14.518,00 €
13100000	Akl	24	Konferenzen für den Wiederaufbau	Mehrere Konferenzen werden sowohl in Präsenz als auch online veranstaltet. Hier fallen vor allem Kosten für die Technik an	HorAk	in Umsetzung	330.000,00 €	8.717,73 €	02.11.2022	8.717,73 €	22.11.2022	8.717,73 €	8.717,73 €	8.717,73 €
13100000	Akl	25	Onlineportal für den Wiederaufbau	Erstellung einer Onlineplattform mit Zugang für relevante Akteure aus Verwaltungen und Bauträgern über einen Zeitraum sowie einem öffentlichen Bereich	HorAk	in Umsetzung	527.727,17 €	150.098,14 €	29.03.2021	139.118,40 €	04.08.2022	139.118,40 €	93.097,16 €	93.097,16 €
					HorAk								41.563,21 €	41.563,21 €
				1. Folgeantrag	HorAk				01.07.2024	385.249,44 €	15.08.2024	385.249,44 €	115.574,83 €	115.574,83 €
13100000	Akl	28	Entsorgen der Ölschlämme und Boden (getrockneter Schlamm)	Entsorgen der Schlämme aus den Zwischenlagern = "1. Folgeantrag"	Abt. 4.5	in Umsetzung	25.000.000,00 €		29.12.2022	9.200.820,38 €	15.03.2023	9.200.820,38 €	9.200.820,38 €	9.200.820,38 €
13100000	Akl	ehemals 29	Entsorgung von Boden (getrockneter Schlamm)	getrockneter und zum Teil gesiebter Schlamm	Abt. 4.5	in Umsetzung		23.668.667,00 €	15.12.21 u. 15.06.22	7.794.765,90 €	04.10.2022	7.794.765,90 €	7.794.765,90 €	7.794.765,90 €
				2. Folgeantrag	Abt. 4.5				29.06.2023	1.421.275,14 €	10.08.2023	1.421.275,14 €	1.421.275,14 €	1.421.275,14 €
				3. Folgeantrag	Abt. 4.5				09.11.2023	1.269.099,78 €	17.12.2023	1.269.099,78 €	1.269.099,78 €	1.269.099,78 €
				4. Folgeantrag	Abt. 4.5				18.12.2023	1.973.461,35 €	26.01.2024	1.973.461,35 €	1.973.461,35 €	1.973.461,35 €
				5. Folgeantrag	Abt. 4.5				08.04.2024	1.661.043,06 €	14.06.2024	1.661.043,06 €	1.661.043,06 €	1.661.043,06 €
				6. Folgeantrag	Abt. 4.5				20.12.2024	348.201,27 €				
13100000	Akl	30	Aufstellen Filtrationsanlage	Filtern von Öl-Wasser-Schlamm-Gemisch	Abt. 4.5	abgeschlossen	260.000,00 €	20.122,80 €	17.12.2021	20.122,80 €	04.10.2022	20.122,80 €	20.122,80 €	20.122,80 €
13100000	Akl	38	Sanieren u. a. Brücken und Gebäude	Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen	Abt. 4.5	in Umsetzung	26.726.000,00 €	26.649.709,92 €	15.06.2022	1.698.569,27 €	15.08.2022	1.698.569,27 €	1.698.569,27 €	1.698.569,27 €
				Nachtrag zum Erstantrag	Abt. 4.5						10.05.2023	107.064,33 €	107.064,33 €	107.064,33 €
				1. Folgeantrag	Abt. 4.5				20.12.2022	16.133.339,90 €	16.03.2023	16.139.983,87 €	16.139.983,87 €	16.139.983,87 €
				2. Folgeantrag	Abt. 4.5				21.07.2023	483.201,73 €	10.08.2023	483.201,73 €	483.201,73 €	483.201,73 €
				3. Folgeantrag	Abt. 4.5				13.11.2023	347.609,67 €	11.12.2023	347.609,67 €	347.609,67 €	347.609,67 €
				4. Folgeantrag	Abt. 4.5				22.05.2024	1.392.762,29 €	13.06.2024	1.392.762,29 €	1.392.762,29 €	1.392.762,29 €
				5. Folgeantrag Zirkuswiese (Los2)	AWB				15.08.2024	287.277,12 €	23.08.2024	229.821,70 €	229.821,70 €	229.821,70 €
				6. Folgeantrag Zirkuswiese (Los2)	AWB				21.01.2025	256,18 €				
13100000	Akl	40	K 003 Pomster - Barweiler	Wiederherstellung Böschung u.a. K 003	Abt. 1.5	abgeschlossen	19.664,44 €	19.664,44 €	03.12.2023	19.664,44 €	31.01.2024	19.664,44 €	19.664,44 €	19.664,44 €
13100000	Akl	41	K 004 BW 5606656 Tierbachbrücke Müsch	Instandsetzung	Abt. 1.5	in Planung	500.500,00 €	- €						
13100000	Akl	42	K 005 Eichenbach - L 73	Böschungssicherung und Durchlasserneuerung K005	Abt. 1.5	abgeschlossen	34.844,69 €	34.844,69 €	03.12.2023	34.844,69 €	31.01.2024	34.844,69 €	34.844,69 €	34.844,69 €
13100000	Akl	44	K 006 Aremberg - Antweiler	Wiederherstellung Böschung u.a. K006	Abt. 1.5	abgeschlossen	99.366,06 €	99.366,06 €	03.12.2023	99.366,06 €	16.01.2024	99.366,06 €	99.366,06 €	99.366,06 €
13100000	Akl	45	K 009 Landesgrenze NRW - Ohlenhard	Instandsetzung	Abt. 1.5	noch offen	32.500,00 €	- €						
13100000	Akl	46	K 009 Ohlenhard - L 74	Wiederherstellung Böschung u.a. K009	Abt. 1.5	abgeschlossen	25.494,24 €	26.390,23 €	03.12.2023	25.494,24 €	16.01.2024	25.494,24 €	25.494,24 €	25.494,24 €

13100000	Akl				Abt. 1.5				12.12.2024	895,99 €	13.01.2025	895,99 €		
13100000	Akl	47	K 013 Einmündung L 74 - Marthel	Wiederherstellung Böschung u.a.	Abt. 1.5	noch offen	25.000,00 €	- €						
13100000	Akl	48	K 014 Landesgrenze NRW - Heistert	Wiederherstellung Böschung u.a. K 014	Abt. 1.5	abgeschlossen	9.101,99 €	9.101,99 €	03.12.2023	9.101,99 €	16.01.2024	9.101,99 €	9.101,99 €	9.101,99 €
13100000	Akl	49	K 015 Antweiler	Asphalтарbeiten K 015	Abt. 1.5	abgeschlossen	14.680,85 €	14.680,85 €	03.12.2023	14.680,85 €	23.01.2024	14.680,85 €	14.680,85 €	14.680,85 €
13100000	Akl	50	K 015 BW 5506828 Brücke OD Antweiler	Instandsetzung K 015	Abt. 1.5	abgeschlossen	29.747,11 €	29.747,11 €	03.12.2023	29.747,11 €	16.01.2024	29.747,11 €	29.747,11 €	29.747,11 €
13100000	Akl	51	K 017 BW 5507579 Brücke Fuchshofen	Instandsetzung	Abt. 1.5	in Umsetzung	373.500,00 €	- €						
13100000	Akl	52	K 024 L 73 - Lückenbach	Beseitigung von Fahrbahnunterspühlungen K 024	Abt. 1.5	abgeschlossen	109.573,22 €	109.573,22 €	03.12.2023	109.573,22 €	10.01.2024	109.573,22 €	109.573,22 €	109.573,22 €
13100000	Akl	53	K 024 Lückenbach, Bachdurchlass	Reinigung Bachdurchlass K 024	Abt. 1.5	abgeschlossen	108.892,86 €	108.892,86 €	03.12.2023	108.892,86 €	16.01.2024	108.892,86 €	108.892,86 €	108.892,86 €
13100000	Akl	54	K 024 BW 5507640 Lückenbachbrücke	Instandsetzung	Abt. 1.5	abgeschlossen	149.500,00 €	- €						
13100000	Akl	55	K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul	Neubau	Abt. 1.5	in Planung	2.250.000,00 €	81.129,43 €						
13100000	Akl	58	K 025 Brückengeländer Behelfsbrücke	Behelfsgeländer auf Bundeswehrbrücke herstellen	Abt. 1.5	abgeschlossen	- €	- €						
13100000	Akl	61	K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul, (Behelfsbrücke)	Rückbau Behelfsbrücke	Abt. 1.5	noch offen	585.000,00 €	- €						
13100000	Akl	62	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers	Neubau	Abt. 1.5	in Planung	2.250.000,00 €	119.063,32 €						
13100000	Akl	63	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Aufbau LZA und Verkehrssicherung	Abt. 1.5	in Umsetzung	8.146,92 €							
13100000	Akl	65	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Herstellung Montageplätze zum Einschub Behelfsbrücke K 028	Abt. 1.5	abgeschlossen	103.683,90 €	103.683,90 €	03.12.2023	103.683,90 €	01.02.2024	103.683,90 €	103.683,90 €	103.683,90 €
13100000	Akl	67	K 028 Brückengeländer Behelfsbrücke	Behelfsgeländer auf Bundeswehrbrücke herstellen	Abt. 1.5	in Umsetzung	- €							
13100000	Akl	69	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Rückbau Behelfsbrücke	Abt. 1.5	noch offen	585.000,00 €	491,47 €						
13100000	Akl	70	K 028 Liers, Bereich Friedhof	Ersatzbauwerk, Instandsetzung Fahrbahn u.a. K 028	Abt. 1.5	abgeschlossen	347.889,01 €	473.807,60 €	03.12.2023	347.889,01 €	23.01.2024	347.889,01 €	347.889,01 €	347.889,01 €
13100000	Akl	71	K 028 OD Liers+ FB zum Friedhof	Instandsetzung Fahrbahn und Rinne	Abt. 1.5	abgeschlossen	200.000,00 €	- €						
13100000	Akl	72	K 028 BW 5507615 Brücke Obliers	Instandsetzung	Abt. 1.5	abgeschlossen	351.000,00 €	- €						
13100000	Akl	73	K 028 BW 5507615 Brücke Obliers	Instandsetzung Brüstungsmauer K 028	Abt. 1.5	abgeschlossen	32.150,88 €	28.640,67 €	03.12.2023	28.640,67 €	19.01.2024	28.640,67 €	28.640,67 €	28.640,67 €
13100000	Akl	74	K 028 OD Obliers	Fahrbahninstandsetzung, Erneuerung Rinnenanlage K 028	Abt. 1.5	abgeschlossen	13.635,02 €	13.635,02 €	03.12.2023	13.635,02 €	19.01.2024	13.635,02 €	13.635,02 €	13.635,02 €
13100000	Akl	75	K 028 Obliers - Liers	Fahrbahninstandsetzung, Erneuerung Rinnenanlage, Böschungen	Abt. 1.5	noch offen	481.000,00 €	- €						
13100000	Akl	76	K 29 Ahrbrück und K 15, Antweiler	Mini-Guard montieren und vorhalten K 029/K 015	Abt. 1.5	abgeschlossen	11.913,71 €	36.024,83 €	03.12.2023	12.749,95 €	19.01.2024	12.749,95 €	12.749,95 €	12.749,95 €
13100000	Akl	77	K 029 BW 5507625 Brücke Brück	Erneuerung	Abt. 1.5	in Planung	3.750.000,00 €	10.290,30 €						
13100000	Akl	78	K 031 Berg - Freisheim	Böschungssicherung, Fahrbahnunterfüllung, Bankette u.a.	Abt. 1.5	abgeschlossen	- €	31.565,19 €						
13100000	Akl	79	K 033 Berg - Vischel	Böschungssicherung, Banketterneuerung u.a. K 033	Abt. 1.5	abgeschlossen	20.471,57 €	20.471,57 €	03.12.2023	20.471,57 €	19.01.2024	20.471,57 €	20.471,57 €	20.471,57 €
13100000	Akl	81	K 35 - provisorische Nebenstrecke	Provisorische Nebenstrecke	Abt. 1.5	in Umsetzung	1.743.000,00 €	2.092.719,25 €	19.01.2023	1.743.000,00 €	23.03.2023	1.743.000,00 €	834.601,00 €	834.601,00 €
					Abt. 1.5								257.932,45 €	257.932,45 €
					Abt. 1.5								377.127,77 €	377.127,77 €
				Mehrkostenantrag	Abt. 1.5				05.08.2024	473.984,00 €	20.08.2024	473.983,83 €	603.570,38 €	603.570,38 €
13100000	Akl	82	K 039 Bengen	Reinigung Straßenentwässerungsgräben	Abt. 1.5	abgeschlossen	- €	2.520,42 €						
13100000	Akl	83	K 040 Oedingen	Reinigung und Spülung von Entwässerungseinrichtungen	Abt. 1.5	abgeschlossen	600,00 €	- €						
13100000	Akl	84	K 069 Niederlützing Felssturz	Felssicherung K 069	Abt. 1.5	abgeschlossen	78.475,23 €	83.055,76 €	03.12.2023	78.475,23 €	19.01.2024	78.475,23 €	78.475,23 €	78.475,23 €
13100000	Akl	85	K 44 Kloster Prüm Straße	Schutzplanken Reparatur K 44	Abt. 1.5	abgeschlossen	6.989,10 €	6.989,10 €	03.12.2023	6.989,10 €	19.01.2024	6.989,10 €	6.989,10 €	6.989,10 €
13100000	Akl	86	K 044	Wiederherstellung Oberbau, Böschung u.a.	Abt. 1.5	noch offen	195.000,00 €	- €						
13100000	Akl	87	Kleinmaßnahmen, Sanierung Umleitungsstrecken, Räumungsarbeiten, allg. Rückbau		Abt. 1.5		2.350.000,00 €	8.560,18 €						

13100000	Akl	88	Baunebenkosten	Grunderwerb, Landespflege, Schlussvermessung	Abt. 1.5		2.350.000,00 €	- €						
13100000	Akl	89	Erstattung der bereits geleisteten Kosten zur Erfassung und Entsorgung der Abfälle von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Gewässern aus dem gesamten Katastrophengebiet	Kosten der Beräumung und Entsorgung von Flutabfällen	AWB	in Umsetzung	147.644.000,00 €	154.064.067,83 €	29.09.2021	74.672.995,79 €	Okt 21	67.316.995,79 €	67.316.995,79 €	67.316.995,79 €
				2. Antrag	AWB				02.11.2021	18.684.830,57 €	15.12.2021	18.684.830,57 €	18.684.830,57 €	18.684.830,57 €
				3. Antrag	AWB				09.12.2021	12.348.243,64 €	24.01.2022	12.348.243,64 €	12.348.243,64 €	12.348.243,64 €
				4. Antrag	AWB				10.01.2022	82.020,20 €	17.02.2022	82.020,20 €	82.020,20 €	82.020,20 €
				5. Antrag	AWB				12.01.2021	9.252.852,02 €	25.04.2022	9.252.852,02 €	9.252.852,02 €	9.252.852,02 €
				6. Antrag	AWB				09.02.2022	3.820.488,99 €	16.05.2022	3.820.488,99 €	3.820.488,99 €	3.820.488,99 €
				7. Antrag	AWB				07.03.2022	3.346.846,03 €	04.07.2022	3.346.846,03 €	3.346.846,03 €	3.346.846,03 €
				8. Antrag	AWB				12.04.2022	4.743.303,27 €	27.05.2022	4.743.303,27 €	4.743.303,27 €	4.743.303,27 €
				9. Antrag	AWB				23.05.2022	4.391.713,53 €	Jul 22	4.391.713,53 €	4.391.713,53 €	4.391.713,53 €
				10. Antrag	AWB				14.06.2022	3.364.791,30 €	29.07.2022	3.364.791,30 €	3.364.791,30 €	3.364.791,30 €
				11. Antrag	AWB				19.07.2022	1.536.489,06 €	02.08.2022	1.536.489,06 €	1.536.489,06 €	1.536.489,06 €
				12. Antrag	AWB				12.08.2022	3.985.830,09 €	05.09.2022	3.985.830,09 €	3.985.830,09 €	3.985.830,09 €
				13. Antrag	AWB				06.10.2022	1.402.550,36 €	09.11.2022	1.402.550,36 €	1.402.550,36 €	1.402.550,36 €
				14. Antrag	AWB				18.10.2022	985.880,39 €	10.11.2022	985.880,39 €	985.880,39 €	985.880,39 €
				15. Antrag	AWB				29.11.2022	1.476.906,23 €	05.12.2022	1.476.906,23 €	1.476.906,23 €	1.476.906,23 €
				16. Antrag	AWB				20.12.2022	927.307,27 €	26.01.2023	927.307,27 €	927.307,27 €	927.307,27 €
				17. Antrag	AWB				23.01.2023	644.798,14 €	15.02.2023	644.798,14 €	644.798,14 €	644.798,14 €
				18. Antrag	AWB				13.03.2023	563.402,79 €	05.04.2023	563.402,79 €	563.402,79 €	563.402,79 €
				19. Antrag	AWB				17.04.2023	473.207,98 €	08.05.2023	473.207,98 €	473.207,98 €	473.207,98 €
				20. Antrag	AWB				26.06.2023	512.721,22 €	25.07.2023	512.721,22 €	512.721,22 €	512.721,22 €
				21. Antrag	AWB				27.10.2023	985.713,79 €	11.12.2023	985.713,79 €	985.713,79 €	985.713,79 €
				22. Antrag	AWB				26.01.2024	1.847.966,58 €	25.03.2024	1.847.966,58 €	1.847.966,58 €	1.847.966,58 €
				23. Antrag	AWB				28.05.2024	480.868,52 €	20.06.2024	480.868,52 €	480.868,52 €	480.868,52 €
				24. Antrag	AWB				07.08.2024	3.532.340,07 €	22.08.2024	3.532.340,07 €	3.532.340,07 €	
				25. Antrag	AWB				21.01.2025	113.956,45 €				
13100000	Akl	90	Interim-Atemschutzwerkstatt	Schaffung eines Aufstellplatzes und Errichtung einer Interim-Atemschutzwerkstatt incl. Einrichtung	BKS	in Umsetzung	700.000,00 €	698.935,01 €	17.11.2021	700.000,00 €	17.02.2022	700.000,00 €	698.935,01 €	629.041,51 €
13100000	Akl	91	Neue Sirenen, Katastrophenschutz	neue, elektronische Sirenen mit Akkupufferung, Sprachdurchsagemöglichkeit und Auslösung mittels TETRA-, POCSAG- (Vorrüstung) und analoger Funktechnik (als Redundanz) sollen aufgebaut werden.	BKS	in Umsetzung	800.000,00 €	495.082,27 €	02.12.2021	800.000,00 €	25.04.2022	800.000,00 €	800.000,00 €	600.000,00 €
13100000	Akl	92	Ausstattung Interim-Atemschutzwerkstatt	Wiederbeschaffung der zerstörten Ausstattung	BKS	abgeschlossen	61.994,36 €	61.994,36 €	07.01.2022	61.994,36 €	25.04.2022	61.994,36 €	61.994,36 €	61.994,36 €
				Mehrkostenantrag	BKS	in Umsetzung	1.648,73 €	1.648,73 €	01.08.2023	1.648,73 €	04.12.2023	1.648,73 €		
13100000	Akl	93	Info-Points	Personal, Container, Materialbeschaffung	V-Stab	in Umsetzung	1.414.753,40 €	1.453.471,03 €	27.10.2023	1.435.988,55 €	05.04.2024	1.435.718,55 €	1.435.718,55 €	1.435.718,55 €
13100000	Akl	94	Notunterkünfte	Containerdorf Mendig; Hotel Bernkastel-Kues; Containerdorf Bad Neuenahr-Ahrweiler	V-Stab	abgeschlossen	2.082.226,34 €	2.183.942,40 €	12.12.2022	849.360,25 €	17.03.2023	849.360,25 €	849.360,25 €	849.360,25 €
				2. Antrag	V-Stab				27.10.2023	1.331.912,68 €	15.04.2024	1.329.242,81 €	1.329.242,81 €	1.329.242,81 €
				3. Antrag	V-Stab				22.05.2024	5.339,34 €	22.07.2024	5.339,34 €	5.339,34 €	5.339,34 €
13100000	Akl	95	Straßenbeleuchtung	Mietkosten für provisorische Straßenbeleuchtung	V-Stab	in Umsetzung	3.687.921,97 €	4.807.455,06 €	11.12.2023	4.807.455,06 €	24.10.2024	3.110.505,70 €		
13100000	Akl	96	Sanitär	Mietkosten für Dixi/Sanitärcontainer	V-Stab	abgeschlossen	1.125.101,57 €	1.266.745,94 €	27.10.2023	1.266.745,94 €	28.02.2024	1.266.745,94 €	1.266.745,94 €	1.266.745,94 €

13100000	Akl	97	Architekten	Honorarkosten für Architekten und Dienstleister (Info-Points)	V-Stab	in Umsetzung	8.042.102,30 €	11.459.995,10 €	22.11.2022	3.803.757,90 €	21.03.2023	3.803.757,90 €	3.803.757,90 €	3.803.757,90 €
				1. Folgeantrag	V-Stab				26.07.2023	1.410.581,69 €	22.09.2023	1.410.581,69 €	1.410.581,69 €	1.410.581,69 €
				2. Folgeantrag	V-Stab				27.02.2024	3.937.790,25 €	26.03.2024	3.937.790,25 €	3.937.790,25 €	3.937.790,25 €
13100000	Akl	99	Brücken	Kosten anlässlich des Brückenbaus	V-Stab	abgeschlossen	1.002.964,89 €	1.034.538,23 €	16.10.2023	1.061.665,15 €	27.12.2023	1.028.416,54 €	1.028.416,54 €	1.028.416,54 €
				2. Antrag	V-Stab		6.121,69 €		12.03.2024	6.121,69 €	18.04.2024	6.121,69 €	6.121,69 €	6.121,69 €
13100000	Akl	100	Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Beladung kreiseigener GW-G Ahrbrück	BKS	abgeschlossen	22.967,62 €	22.967,62 €	25.01.2022	22.967,62 €	13.04.2022	22.967,62 €	22.967,62 €	22.967,62 €
13100000	Akl	101	Brand- und Katastrophenschutz	Instandsetzung kreiseigenes TLF 24/50 Ahrweiler	BKS	abgeschlossen	16.071,77 €	17.591,76 €	25.01.2022	16.071,77 €	13.04.2022	16.071,77 €	16.071,77 €	16.071,77 €
13100000	Akl	102	Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Dekontaminationsausrüstung	BKS	in Umsetzung	12.315,02 €	4.855,87 €	05.07.2022	4.354,54 €	Jul 22	4.354,54 €		
			Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung von zwei Kontaminationsmonitoren für den Strahlenschutzzeinsatz	BKS	in Umsetzung			05.02.2024	7.960,48 €				
13100000	Akl	103	Mehraufwendungen Beförderung Kindertagesstätten	Mehraufwendungen Beförderung Kindertagesstätten	Abt. 2.2	in Umsetzung	1.095.445,06 €	1.112.833,27 €	15.08.2023	1.095.445,06 €	30.11.2023	1.095.445,06 €	1.095.445,06 €	1.095.445,06 €
13100000	Akl	106	Mehrkosten der Beförderung von beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Eingliederungshilfe (derzeit voraussichtlich bis 2028)	Beförderung zu Orten mit größerer Entfernung als im Regelbetrieb	Abt. 4.1	in Umsetzung	900.000,00 €	400.000,00 €						
13100000	Akl	107	Mehrkosten der Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Schülerbeförderung (derzeit voraussichtlich bis 2028)	Beförderung zu Orten mit größerer Entfernung als im Regelbetrieb	Abt. 4.1	in Umsetzung	12.000.000,00 €	2.900.000,00 €						
13100000	Akl	108	Sanierung Sporthallen	Neuaufbau der inneren Bereiche der Sporthallen (Böden, Tore, Türen, Prallschutz, Fußbodenheizung, etc.)	ESG	in Umsetzung	6.000.000,00 €	4.162.369,39 €	28.09.2023	5.363.638,39 €	03.06.2024	5.363.638,39 €	5.363.638,39 €	5.033.978,05 €
13100000	Akl	109	Sanieren u.a. Brücken und Gebäude	Bodenproben	Abt. 4.5	in Umsetzung	50.000,00 €							
13100000	Akl	110	Sanieren u.a. Brücken und Gebäude	Gutachterkosten	Abt. 4.5	in Umsetzung	40.000,00 €	184.691,15 €	24.08.2023	48.999,28 €	27.09.2023	48.999,28 €	48.999,28 €	48.999,28 €
				1. Teilantrag	Abt. 4.5		115.142,04 €		09.11.2023	115.142,04 €	11.12.2023	115.142,04 €	115.142,04 €	115.142,04 €
				2. Teilantrag	Abt. 4.5		25.118,24 €		10.06.2024	25.118,24 €	25.06.2024	25.118,24 €	25.118,24 €	25.118,24 €
13100000	Akl	111	Ausstattung Artenschutz	Wiederbeschaffung eines Amphibienzauns	Abt. 4.5	abgeschlossen	5.184,64 €	5.184,64 €	23.05.2022	5.184,64 €	15.07.2022	5.184,64 €	5.184,64 €	5.184,64 €
13100000	Akl	112	Beräumung Ahrmündung	Entsorgung von Abfällen	Abt. 4.5	abgeschlossen	66.290,14 €	66.290,14 €	14.11.2022	66.290,14 €	24.11.2022	66.290,14 €	66.290,14 €	66.290,14 €
13100000	Akl	113	K005 - L 74	Montage Schutzplanken K 005	Abt. 1.5	abgeschlossen	31.379,65 €	31.379,64 €	03.12.2023	31.379,65 €	19.01.2024	31.379,65 €	31.379,65 €	31.379,65 €
13100000	Akl	114	K 015 BW5506828 Brücke OB Antweiler	Instandsetzung Mauerwerk	Abt. 1.5	abgeschlossen	77.303,74 €	72.325,26 €						
13100000	Akl	115	K 017 BW 5507579 Brücke Fuchshofen	Instandsetzung Mauerwerk	Abt. 1.5	abgeschlossen	11.803,92 €	12.827,43 €	06.05.2024	12.827,43 €	10.06.2024	12.827,43 €	12.827,43 €	12.827,43 €
13100000	Akl	116	K 025 Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke)	Montage Schutzplanken K 025	Abt. 1.5	abgeschlossen	19.311,44 €	19.311,44 €	03.12.2023	19.311,44 €	05.02.2024	19.311,44 €	19.311,44 €	19.311,44 €
13100000	Akl	117	K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke)	Austausch Behelfsbrücke	Abt. 1.5	abgeschlossen	4.165,00 €	4.165,00 €	12.12.2024	4.165,00 €	15.01.2025	4.165,00 €		
13100000	Akl	118	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Austausch Behelfsbrücke	Abt. 1.5	abgeschlossen	4.165,00 €	4.165,00 €	12.12.2024	4.165,00 €				
13100000	Akl	119	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers, (Behelfsbrücke)	Montage Schutzplanken K 028	Abt. 1.5	abgeschlossen	20.930,00 €	20.927,46 €	03.12.2023	20.927,46 €	01.02.2024	20.927,46 €	20.927,46 €	20.927,46 €
13100000	Akl	120	K 017 BW 5007 970, K 25 BW 5507 971, K 28 BW 5507 972	Sonderprüfung an Gefechtsfeldbrücke K017/K025/K028	Abt. 1.5	abgeschlossen	7.711,20 €	22.746,47 €	03.12.2023	7.711,20 €	19.01.2024	7.711,20 €	7.711,20 €	7.711,20 €
13100000	Akl	121	K 030 BW 5407871 Brücke bei Burgsahr	Bachverlegung und Böschungssicherung	Abt. 1.5	abgeschlossen	52.152,35 €	- €						
13100000	Akl	122	K 031 Berg - Freisheim	Montage Schutzplanken K 031	Abt. 1.5	abgeschlossen	6.521,80 €	6.521,80 €	03.12.2023	6.521,80 €	23.01.2024	6.521,80 €	6.521,80 €	6.521,80 €
13100000	Akl	123	K 034 BW 5408 585 Brücke Holzweiler	Sohleernewerung	Abt. 1.5	in Umsetzung	310.565,00 €	272.320,89 €						
13100000	Akl	124	K 044 Mitfahrerparkplatz	Reinigung Mitfahrerparkplatz K 044	Abt. 1.5	abgeschlossen	836,67 €	2.510,01 €	03.12.2024					
									13.12.2024	2.510,00 €	20.01.2025	2.510,01 €		
13100000	Akl	125	K 024 OD Lückenbach	Wiederherstellung Böschung u.a.	Abt. 1.5	abgeschlossen	378.157,81 €	257.241,40 €	12.12.2024	309.000,00 €				
13100000	Akl	126	Allgemeine EI-Leistungen	Pauschalansatz	Abt. 1.5		500.000,00 €	23.107,00 €						
13100000	Akl	127	Erfassung Infrastruktur, Bauwerke im Flutgebiet	Erfassung Infrastruktur, Bauwerke im Flutgebiet	Abt. 1.5	abgeschlossen	12.189,00 €	12.189,00 €	06.05.2024	12.189,00 €	10.06.2024	12.189,00 €	12.189,00 €	12.189,00 €

13100000	Akl	128	Kontrolle Schadensbeseitigung an Bestandsbauwerken/Überwachung, Belastungsversuche und Standsicherheitsbewertungen	Kontrolle Schadensbeseitigung an Bestandsbauwerken/Überwachung, Belastungsversuche und Standsicherheitsbewertungen	Abt. 1.5	abgeschlossen	2.018,24 €	2.018,24 €	06.05.2024	2.018,24 €	10.06.2024	2.018,24 €	2.018,24 €	2.018,24 €
13100000	Akl	129	Wiederbeschaffung zerstörter LKW	Ersatzbeschaffung	AWB	abgeschlossen	79.463,87 €	81.277,00 €	19.02.2024	50.740,87 €	11.03.2024	50.740,87 €	50.740,87 €	50.740,87 €
13100000	Akl	130	Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Übungs-Chemieschutzanzüge	BKS	in Umsetzung	20.768,83 €	20.768,83 €	14.04.2022	20.768,83 €	27.06.2022	20.768,83 €	21.639,91 €	21.639,91 €
13100000	Akl	131	Räumung, Säuberung und Sicherung der Phillip Freiherr von Boeselager Realschule Plus	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	in Umsetzung	650.000,00 €	1.110.842,82 €	15.03.2024	734.990,65 €	03.06.2024	734.990,65 €	734.990,65 €	734.990,65 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	48.179,34 €	13.08.2024	48.197,34 €	48.197,34 €	48.197,34 €
13100000	Akl	132	Räumung, Säuberung und Sicherung der Don-Bosco-Schule	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	in Umsetzung	300.000,00 €	675.906,68 €	15.03.2024	116.726,61 €	03.06.2024	116.726,61 €	116.726,61 €	116.726,61 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	374.008,80 €	14.08.2024	374.008,80 €	374.008,80 €	374.008,80 €
13100000	Akl	133	Räumung, Säuberung und Sicherung der Levana-Schule	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	in Umsetzung	500.000,00 €	356.143,75 €	15.03.2024	109.728,69 €	03.06.2024	109.728,69 €	109.728,69 €	109.728,69 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	278.361,08 €	14.08.2024	272.607,08 €	272.607,08 €	272.607,08 €
13100000	Akl	134	Räumung, Säuberung und Sicherung des Peter-Jörres-Gymnasiums	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	in Umsetzung	750.000,00 €	797.375,54 €	29.09.2023	624.825,19 €	26.01.2024	624.825,19 €	624.825,19 €	624.825,19 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	212.213,01 €	13.08.2024	212.213,01 €	212.213,01 €	212.213,01 €
13100000	Akl	135	Räumung, Säuberung und Sicherung des Are-Gymnasiums	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	in Umsetzung	2.900.000,00 €	4.145.613,85 €	15.03.2024	1.170.006,57 €	03.06.2024	1.170.006,57 €	1.170.006,57 €	1.170.006,57 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	2.093.639,20 €	16.08.2024	2.077.177,93 €	2.077.177,93 €	2.077.177,93 €
13100000	Akl	136	Räumung, Säuberung und Sicherung des Rhein-Gymnasiums	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	in Umsetzung	1.300.000,00 €	1.886.007,81 €	15.03.2024	601.061,44 €	03.06.2024	601.061,44 €	601.061,44 €	601.061,44 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	797.022,99 €	15.08.2024	797.022,99 €	797.022,99 €	797.022,99 €
13100000	Akl	137	Räumung, Säuberung und Sicherung der Berufsbildende Schule	Vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau u. a. Räumung, Säuberung und Sicherung des Schulstandorts	ESG	in Umsetzung	1.600.000,00 €	2.525.959,31 €	15.03.2024	1.458.983,42 €	03.06.2024	1.458.792,47 €	1.458.792,47 €	1.458.792,47 €
				Mehrkostenantrag	ESG				30.07.2024	873.695,65 €	15.08.2024	871.613,13 €	871.613,13 €	871.613,13 €
13100000	Akl	138	K 004 BW 5606656 Trierbachbrücke Müsch (A. 11-21-7108.01)	Teilweise beschädigt	Abt. 1.5	in Planung	60.000,00 €							
13100000	Akl	139	K 015 BW 5506828 Brücke OD Antweiler (A.11-21-7103.02)	Instandsetzung Mauerwerk	Abt. 1.5	abgeschlossen	505.000,00 €	- €						
13100000	Akl	140	K 005 Hühnerbachbrücke	Beseitigung Auskolkungen	Abt. 1.5	abgeschlossen	38.835,11 €	44.301,50 €	06.05.2024	44.301,50 €	11.06.2024	44.301,50 €	44.301,50 €	44.301,50 €
13100000	Akl	141	K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers	Voruntersuchungen	Abt. 1.5	abgeschlossen	7.081,33 €	7.081,33 €	13.12.2024	7.081,33 €				
13100000	Akl	142	K 029 OD Ahrbrück	K 029 OD Ahrbrück	Abt. 1.5	abgeschlossen	11.691,56 €	- €						
13100000	Akl	143	K 030 BW 5407871 Brücke bei Burgsahr	Wiederherstellung Befahrbarkeit	Abt. 1.5	abgeschlossen	12.203,75 €	12.322,82 €	06.05.2024	12.322,82 €	11.06.2024	12.322,82 €	12.322,82 €	12.322,82 €
13100000	Akl	144	K 030	Böschung und Fahrbahn wiederherstellen	Abt. 1.5	abgeschlossen	50.000,00 €	- €						

13100000	Akl	145	K 035 Dernau - Esch	Vermessung + Obj.-Pl. Verkehrsanlagen	Abt. 1.5	in Umsetzung	25.880,91 €	- €							
13100000	Akl	146	K 035 Dernau - Esch	Instandsetzung	Abt. 1.5	in Umsetzung	1.700.000,00 €	5.935,45 €							
13100000	Akl	147	K 013 Pitscheid	Straßenbau - Absackungen	Abt. 1.5	in Planung	100.000,00 €	2.389,26 €							
13100000	Akl	148	Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Ölsperre Ahrweiler	BKS	in Umsetzung	12.255,21 €	12.255,21 €	31.07.2023	12.255,21 €	05.10.2023	12.255,21 €	12.255,21 €	12.255,21 €	12.255,21 €
13100000	Akl		K 035 Steinbergsmühle	Reinigung und Instandsetzung der Entwässerung	Abt. 1.5	in Umsetzung	35.000,00 €	- €							
13100000	WA	12	Beseitigung von Schäden an Einrichtungen der Abfallwirtschaft	Beseitigung von Schäden am Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" - AWZ	AWB	in Planung	800.000,00 €	800.000,00 €							
13100000	WA	58	Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement	Wissenstransfer zum klimagerechten Wiederaufbau	AWB	in Umsetzung	300.000,00 €	281.000,00 €	07.02.2023	262.000,00 €	Jul 23	251.300,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00
13100000	HuW	1	Wiederherstellung Ufer und Böschung VG Adenau	neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse	HorAk	entfällt	24.900.000,00 €		30.06.2023	880.000,00 €					
13100000	HuW	2	Wiederherstellung Ufer und Böschung Trierbach zwischen Bauler und Müsch	Reinigung und Sanierung Ufer und Böschung	HorAk	in Planung	2.300.000,00 €	50.380,00 €	30.06.2023	82.000,00 €					
13100000	HuW	3	Wiederherstellung Ufer und Böschung Adenauer Bach zwischen Dümpelfeld und Adenau	Reinigung und Sanierung Ufer und Böschung	HorAk	in Planung	1.700.000,00 €	47.330,92 €	30.06.2023	72.000,00 €					
13100000	HuW	4	Wiederherstellung Ufer und Böschung VG Altenahr	neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse	HorAk	in Planung	123.500.000,00 €	1.900.000,00 €	30.06.2023	12.750.000,00 €	12.07.2023	3.950.000,00 €	1.897.164,00 €	1.897.164,00 €	1.897.164,00 €
13100000	HuW	5	Wiederherstellung Ufer und Böschung Stadt BN AW	neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse	HorAk	in Planung	70.500.000,00 €	791.663,95 €	30.06.2023	11.660.000,00 €	19.07.2023	2.700.000,00 €	539.013,88 €	539.013,88 €	539.013,88 €
				Mehrkostenantrag	HorAk						17.05.2024	900.000,00 €			
13100000	HuW	6	Wiederherstellung Ufer und Böschung Stadt Sinzig	neues Geässerbett, Uferbefestigung, Sicherung Abflussbereiche, Abriss Abflusshindernisse	HorAk	in Planung	3.500.000,00 €	68.530,00 €	30.06.2023	137.500,00 €	17.01.2024	1.000.000,00 €	68.530,00 €	68.530,00 €	68.530,00 €
13100000	HuW	7	Wiederherstellungskonzept Ahr und Nebengewässer	Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen	HorAk	abgeschlossen	800.000,00 €	761.503,00 €	04.05.2022	800.000,00 €	24.10.2022	800.000,00 €	613.000,00 €	613.000,00 €	613.000,00 €
													105.784,00 €	105.874,00 €	105.874,00 €
13100000	HuW	8	Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHocheifel"	Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen	HorAk	in Umsetzung	140.000,00 €	132.965,00 €	31.05.2023 / 24.08.2023	132.965,00 €	25.09.2023	132.965,00 €	132.965,00 €	132.965,00 €	132.965,00 €
13100000	HuW	9	Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHocheifel"	Wiederherstellung von Grünlandflächen am Gewässer	HorAk	entfällt	6.000,00 €								
13100000	HuW	10	Wiederherstellung Projektmaßnahmen "ObereAhrHocheifel"	Planerstellung für die Wiederherstellung von Gewässerstrukturen	HorAk	in Planung	67.000,00	2.775,08 €	10.08.2023	67.000,00 €	28.08.2023	66.300,00 €			
13100000	HuW	11	Wiederherstellung von Ahrufer und Böschung, Hauptstraße 4, Schuld	Wiederherstellung Uferbefestigung, Sicherung der Böschung	HorAk	in Planung	1.300.000,00 €	16.128,23 €	24.01.2024	334.800,00 €	25.03.2024	334.800,00 €	16.900,00 €	16.900,00 €	16.900,00 €
13100000	HuW	12	Fischbesatz in der Ahr	Wiederherstellung des Fischbesatzes	HorAk	entfällt	100.000,00 €								
13100000	HuW	13	Projektsteuerungsleistungen zur Umsetzung des Gewässerwiederherstellungskonzepts	Beseitigung flutbedingter Schäden und Wiederherstellung eines "intakten" Gewässers	HorAk	in Planung	4.760.487,90 €	479.054,00 €	10.07.2024	5.000.000,00 €	29.07.2024	2.000.000,00 €	479.054,00 €	479.054,00 €	479.054,00 €
13100000	HuW	14	Grunderwerb im Ahrtal	Inner- und außerörtlicher unfernaher Grundstückserwerb	HorAk	in Umsetzung	300.000,00 €	713.000,00 €	31.10.2024	300.000,00 €	03.12.2024	43.453,00 €	43.453,00 €	43.453,00 €	43.453,00 €
